

ZMLUVA O DIELO

je uzavretá podľa a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo zmluvy u objednávateľa:

Číslo zmluvy u zhotoviteľa:

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Obec Demänová Dolina

031 01 Demänovská Dolina 258

Richard Bros, starosta obce

00315168

2020581321

VÚB Banka, a.s. Liptovský Mikuláš

SK81 0200 0000 0000 1952 9342

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zapísaný v:

Zastúpená:

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach zmluvných

vo veciach technických

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

MK TRAIL PROS, s.r.o.

Juraja Fándlyho 2160/4, 010 01 Žilina

OR OS Žilina, odd.: Sro, vložka číslo: 72690/L

Michael Kolář

52480674

2121063252

SK2121063252

Tatra banka, a.s.

SK20 1100 0000 0029 4311 6526

Preambula

1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom v podlimitnej zákazke s názvom: Bikepark Jasná - Priehyba - Biel Pút k projektu s názvom: Bikepark Jasná - Priehyba - Biel Pút.
2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok verejného obstarávania.
3. Objednávateľ poveruje výkonom stavebného dozoru na stavbe: Ing. Arch. Ján Ďurica, osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky ev.č.: 01377*10*
4. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho na stavbe: Ing. Martin Pleva (osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky ev.č.: 09917*10*)

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas a v požadovanej kvalite vykonať dielo (stavbu) Bikepark Jasná - Priehyba - Biel Pút podľa Projektovej dokumentácie a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
2. Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je špecifikované v prílohách č. 1 až 3 tejto Zmluvy o dielo.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné.

II.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov nasledovne:

Celková cena za predmet zmluvy bez DPH	115 006,00 €
DPH	26 451,38 €
Celková cena za predmet zmluvy s DPH	141 457,38 €

Slovom: **stoštyridsaťjedentisícštyristopäťdesiat sedem eur a tridsaťosem centov EUR**

Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany a sú v nej zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu.

2. Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
3. Fakturovať je možné za vykonané stavebné práce ako celok po protokolárnom prebratí stavebných prác Objednávateľom, alebo jednotlivo za zrealizované stavebné práce, v trojmesačných intervaloch, po ich protokolárnom prebratí Objednávateľom.
4. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi a to po protokolárnom prevzatí vykonaných stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo forme protokolu, vrátane fotodokumentácie.
5. Preddavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený túto vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.

III.

Čas a miesto plnenia

1. Miestom plnenia: Katastrálne územie: Demänovská Dolina.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy do 180 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska. Dielo sa začne realizovať dňom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po výzve objednávateľa prevziať stavenisko.
3. Dodržiavanie termínu podľa bodov 2 a 3 tohto článku Zmluvy je podmienené poskytnutím súčinnosti Objednávateľa.
4. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s technickou správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je Zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.
5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

IV.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
2. Práva a povinnosti Objednávateľa
 - a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
 - b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.
 - c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
 - d) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu dohodnutú v čl. II., bod 1 za vykonanie diela, dohodnutú v Zmluve o dielo, a to len za predpokladu, že dielo bude zodpovedať podmienkam ustanoveným Zmluvou o dielo a bude mu protokolárne odovzdané preberacím protokolom bez väd.

- e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej správe, projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ a to písomnou formou a výlučne v prípadoch uvedených v § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl.II. tejto zmluvy.
- c) Zhotoviteľ zabezpečí záručný servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela.
- d) Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa. Ďalej je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihladením na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- e) V prípade, že subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- f) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
- g) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa – Stavebný dozor / Autorský dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela.
- h) Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa.
- i) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie Stavebného dozoru / Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.
- j) Ak počas realizácie Zhotoviteľ odkryje archeologické nálezy, je zhotoviteľ povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnuté

- opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologický ústav.
- k) Zhotoviteľ je povinný, v prípade potreby, zabezpečiť osadenie dočasného dopravného značenia vopred odsúhlaseného s príslušným dopravným inšpektorátom a príslušným správnym orgánom.
 - l) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.
 - m) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
 - n) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú.
 - o) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.
 - p) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.
 - q) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.
 - r) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovných dní.
 - s) Zhotoviteľ je povinný vyzývať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú v budúcnosti zakryté a to min. 2 pracovné dni vopred, zápisom do stavebného denníka. Bez prevzatia nesmú byť takéto práce zakryté ďalšou stavebnou činnosťou.
 - t) Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom stavenisku pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi Objednávateľovi.
 - u) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí realizáciu diela pred dohodnutým termínom.
 - v) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.
 - w) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade za obdobie, v

ktorom bol zistený nedostatok, 50,- EUR za každého pracovníka a každý nedostatok. Zistené porušenie nosenia ochranných pomôcok bude zapísané do stavebného denníka, čo bude podkladom na uplatnenie pokuty.

- x) Stavebný dozor objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na stavenisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. V prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medziľudského správania sa, je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé zistenie.
- y) Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- z) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou, tak, aby mal Objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa právo vykázať zo stavby.
- aa) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných Objednávateľom, s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.
- bb) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, Objednávateľ má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, a tiež má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € a to za každý aj začatý deň omeškania.
- cc) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na predchádzajúci pracovný deň.
- dd) Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady fotodokumentáciu realizácie predmetu zmluvy a túto odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní diela.
- ee) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

V.

Záruka

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez väd a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) rokov, s výnimkou časti diela, kde dodávateľa/zhotoviteľa týchto častí poskytujú kratšiu záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov. Záruka na všetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, že Objednávateľ si splní povinnosti vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na údržbu a servis a/alebo z príslušných technických špecifikácií. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade poruchy jednotlivých častí predmetu zmluvy, zabezpečí

odstránenie poruchy do 3 dní od oznámenia poruchy. Telefónne číslo na nahlasovanie porúch je: +421 944 944 890

3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi, okrem havarijných stavov, kedy je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do 24 hodín od oznámenia vady Objednávateľom. O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním ktorého potvrdia Stavebný dozor a obe zmluvné strany odstránenie reklamovanej vady.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:
 - a) neodstráni vady diela v dohodnutom termíne podľa bodu 3 tohto článku alebo;
 - b) nepristúpi k odstraňovaniu väd diela v termíne požadovanom Objednávateľom alebo;
 - c) neodstráni vady Diela správne;Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 5 tohto článku.
5. V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 4 tohto článku, tak Objednávateľ je oprávnený:
 - a) požadovať od Zhotoviteľa zníženie Ceny Diela alebo;
 - b) odstrániť vady Diela sám a to na náklady Zhotoviteľa alebo;
 - c) zabezpečiť odstránenie väd Diela prostredníctvom tretej osoby a to na náklady Zhotoviteľa.Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.
6. Náhradu nákladov podľa bodov 4 a 5 tohto článku môže Objednávateľ vykonať vystavením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto článku, pričom takáto faktúra je splatná do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia Zhotoviteľovi.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela, ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným zaobchádzaním s dielom Objednávateľom po prevzatí diela.
8. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.
9. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.

VI.

Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie staveniska Zhotoviteľovi. Preukázateľnosť odovzdania staveniska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecno-záväznými predpismi a technickými normami.
3. Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy a ukončenie realizácie stavebných prác podľa čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávateľa.
5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.

6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na stavenisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu zmluvy.
7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinnosti Zhotoviteľa okamžite zastaviť výkon dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie staveniska, privolať orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávateľa, iné zložky štátnych orgánov (inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne zaznamenať priebeh porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľa stavebných prác pri porušení jeho povinností vyplývajúcich mu z dohody, Zmluvy.
8. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizácii stavebných prác zistí skryté prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných prác dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
9. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na majetku Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.

VII.

Zmluvná pokuta

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, pokiaľ toto vzniklo výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa a nie z dôvodov na strane Objednávateľa, resp. z dôvodov vyššej moci .
2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením väd a nedorobkov oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide o havarijný stav je zmluvná pokuta vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho odstránenia havarijného stavu.
3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu o viac ako 30 dní, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
4. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
 - a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
 - b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany.
3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
 - a) neprevzatie staveniska v stanovenej lehote podľa článku III. Čas a miesto plnenia, bod 2,
 - b) omeškanie Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v článku II. Čas a miesto plnenia, bod 2 o viac ako 14 dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
 - c) Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi predmet zmluvy takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou,
 - d) Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní.
 - e) porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa článku IV., bod 3 písm. d) a e) tejto zmluvy,
 - f) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN.
4. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
5. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, pandémie a epidémie atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

IX. Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií

1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovat' ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy.

X. Kontrola

1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s realizáciou predmetu zákazky, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie a vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1: Cenová kalkulácia – Výkaz výmer
Príloha č. 2: Projektová dokumentácia (na CD/DVD, USB a pod.)
Príloha č. 3: Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel (na CD/DVD, USB a pod.)
Príloha č. 4: Informácie o subdodávateľoch
2. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnení v zmysle platnej legislatívy.
3. Platnosť zmluvy skončí ukončením predmetu zmluvy.
4. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
6. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.
7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
8. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál. Každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

11. Zmluva bola pred podpísaním nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

za Zhotoviteľa
v Žiline dňa 28.5.2026

za Objednávateľa
v D. DOUKE dňa 28.5.2026

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 0005
Stavba: BIKEPARK Jasná - Priehyba - Biela Púť

JKSO:
Miesto: k.ú. Demänovská Dolina

Objednávateľ:
Tatry mountain resorts, a.s.

Zhotoviteľ:
MK TRAIL PROS, s. r. o.

Projektant:
Ing. arch. Boris Bartánus

Spracovateľ:
Matej Haluška

Poznámka:

ČS:
Dátum: 2026-05-15

IČO:
IČ DPH:

IČO: 52480674
IČ DPH: SK2121063252

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	115,006.00
--------------	------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23.00%	0.00	0.00
znižená	23.00%	115,006.00	26,451.38

Cena s DPH	v	EUR	141,457.38
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0005

Stavba: BIKEPARK Jasná - Priehyba - Biela Púť

Miesto: k.ú. Demänovská Dolina

Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ: Tatry mountain resorts, a.s.

Projektant: Ing. arch. Boris Bartánus

Zhotoviteľ: MK TRAIL PROS, s. r. o.


Spracovateľ: Matej Haluška


Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------


Náklady z rozpočtov

115,006.00 141,457.38


0006	TRAT 1 USEK 1A	9,380.00	11,537.40
0007	TRAT 1 USEK 1B	48,780.00	59,999.40
0008	TRAT 2 USEK 2A	22,101.00	27,184.23
0009	TRAT 2 USEK 2B	34,745.00	42,736.35

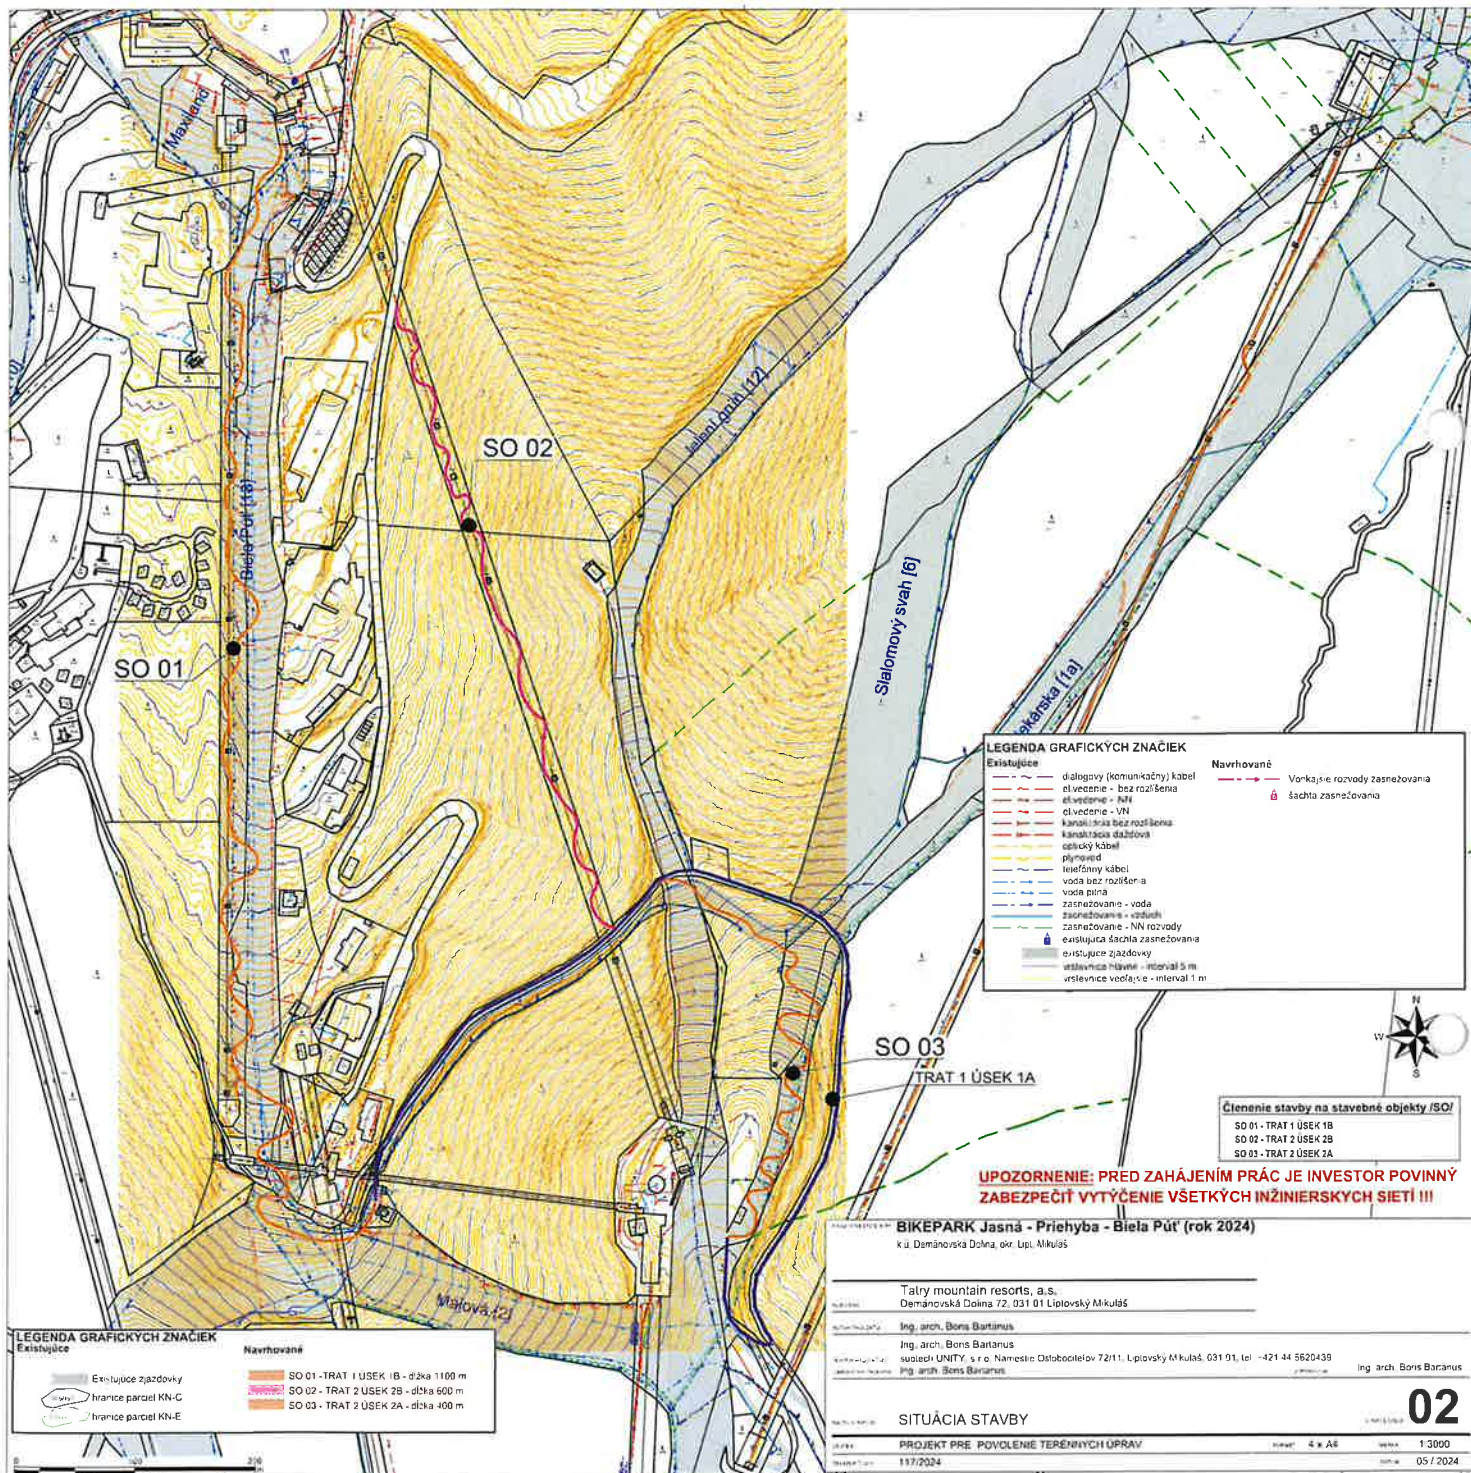

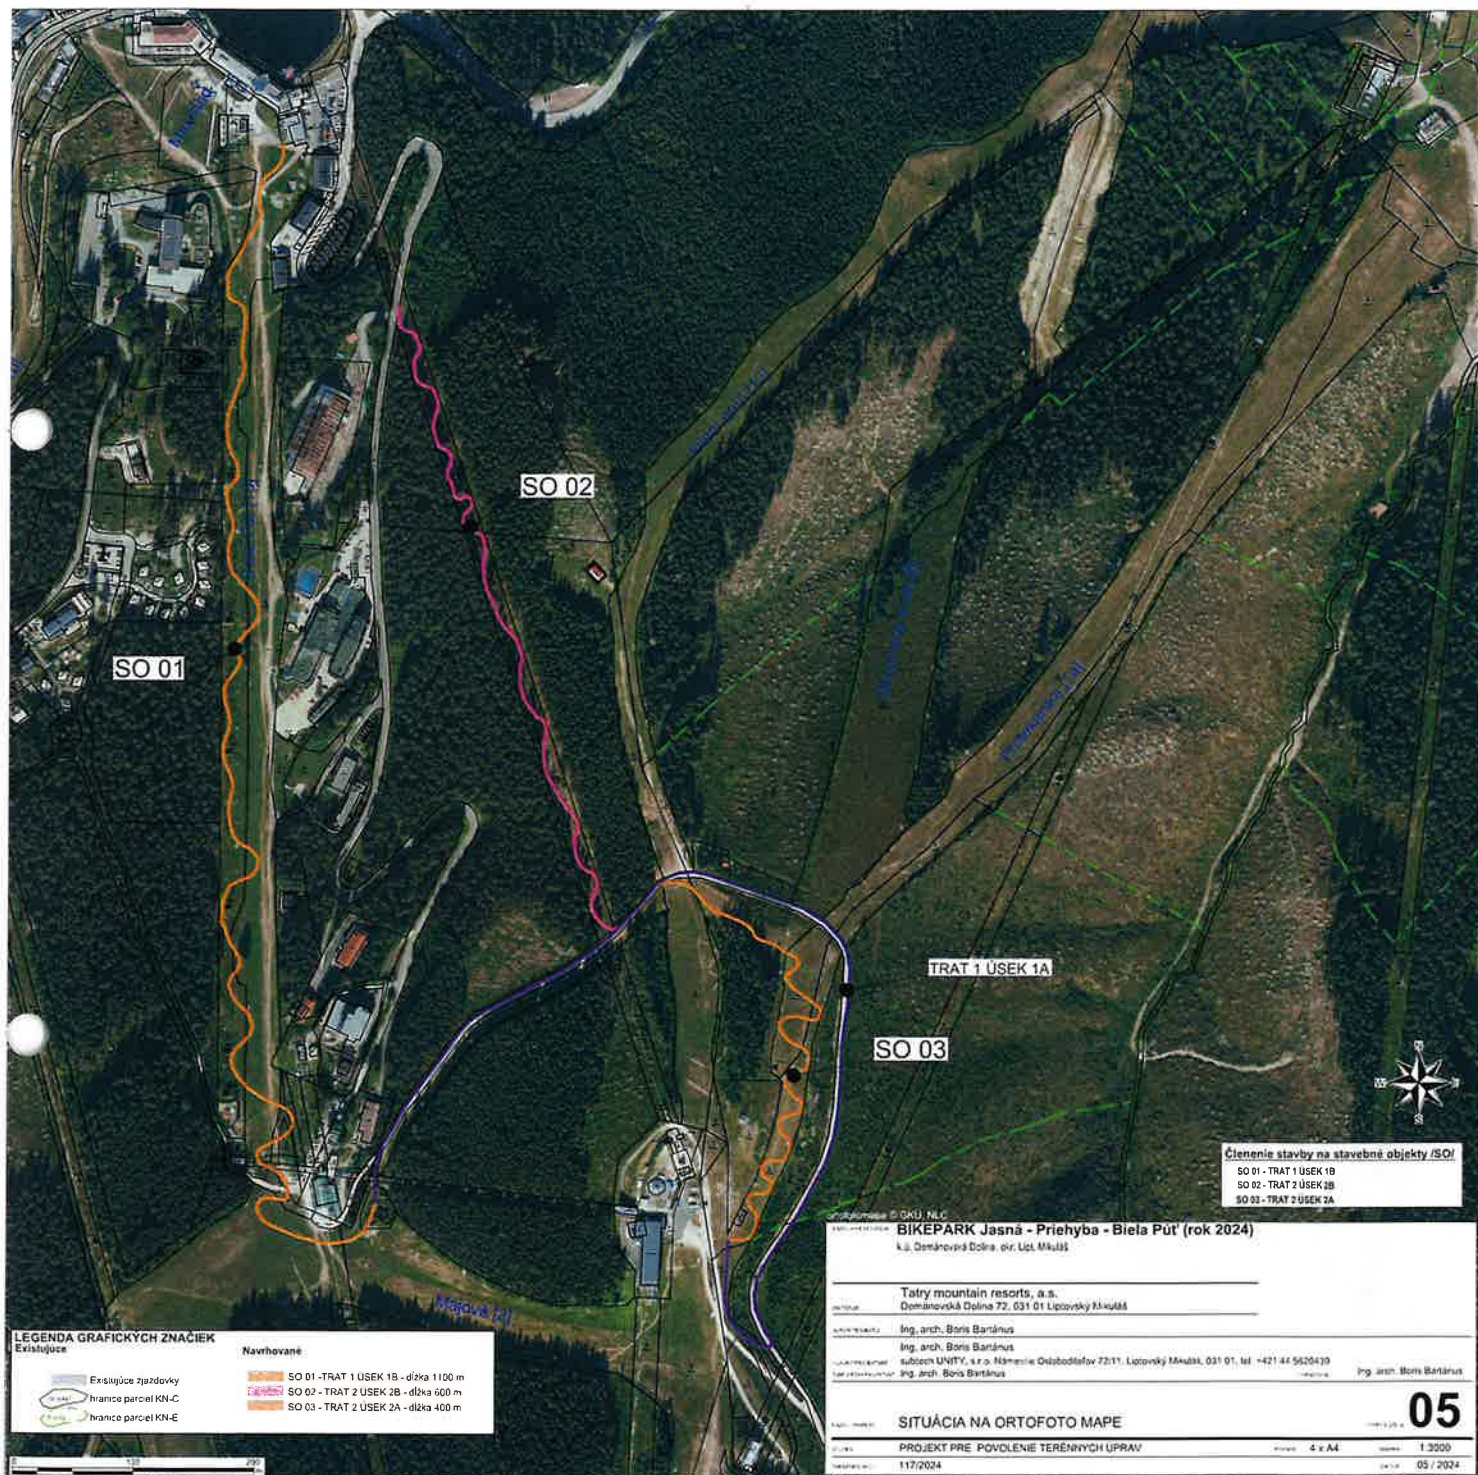


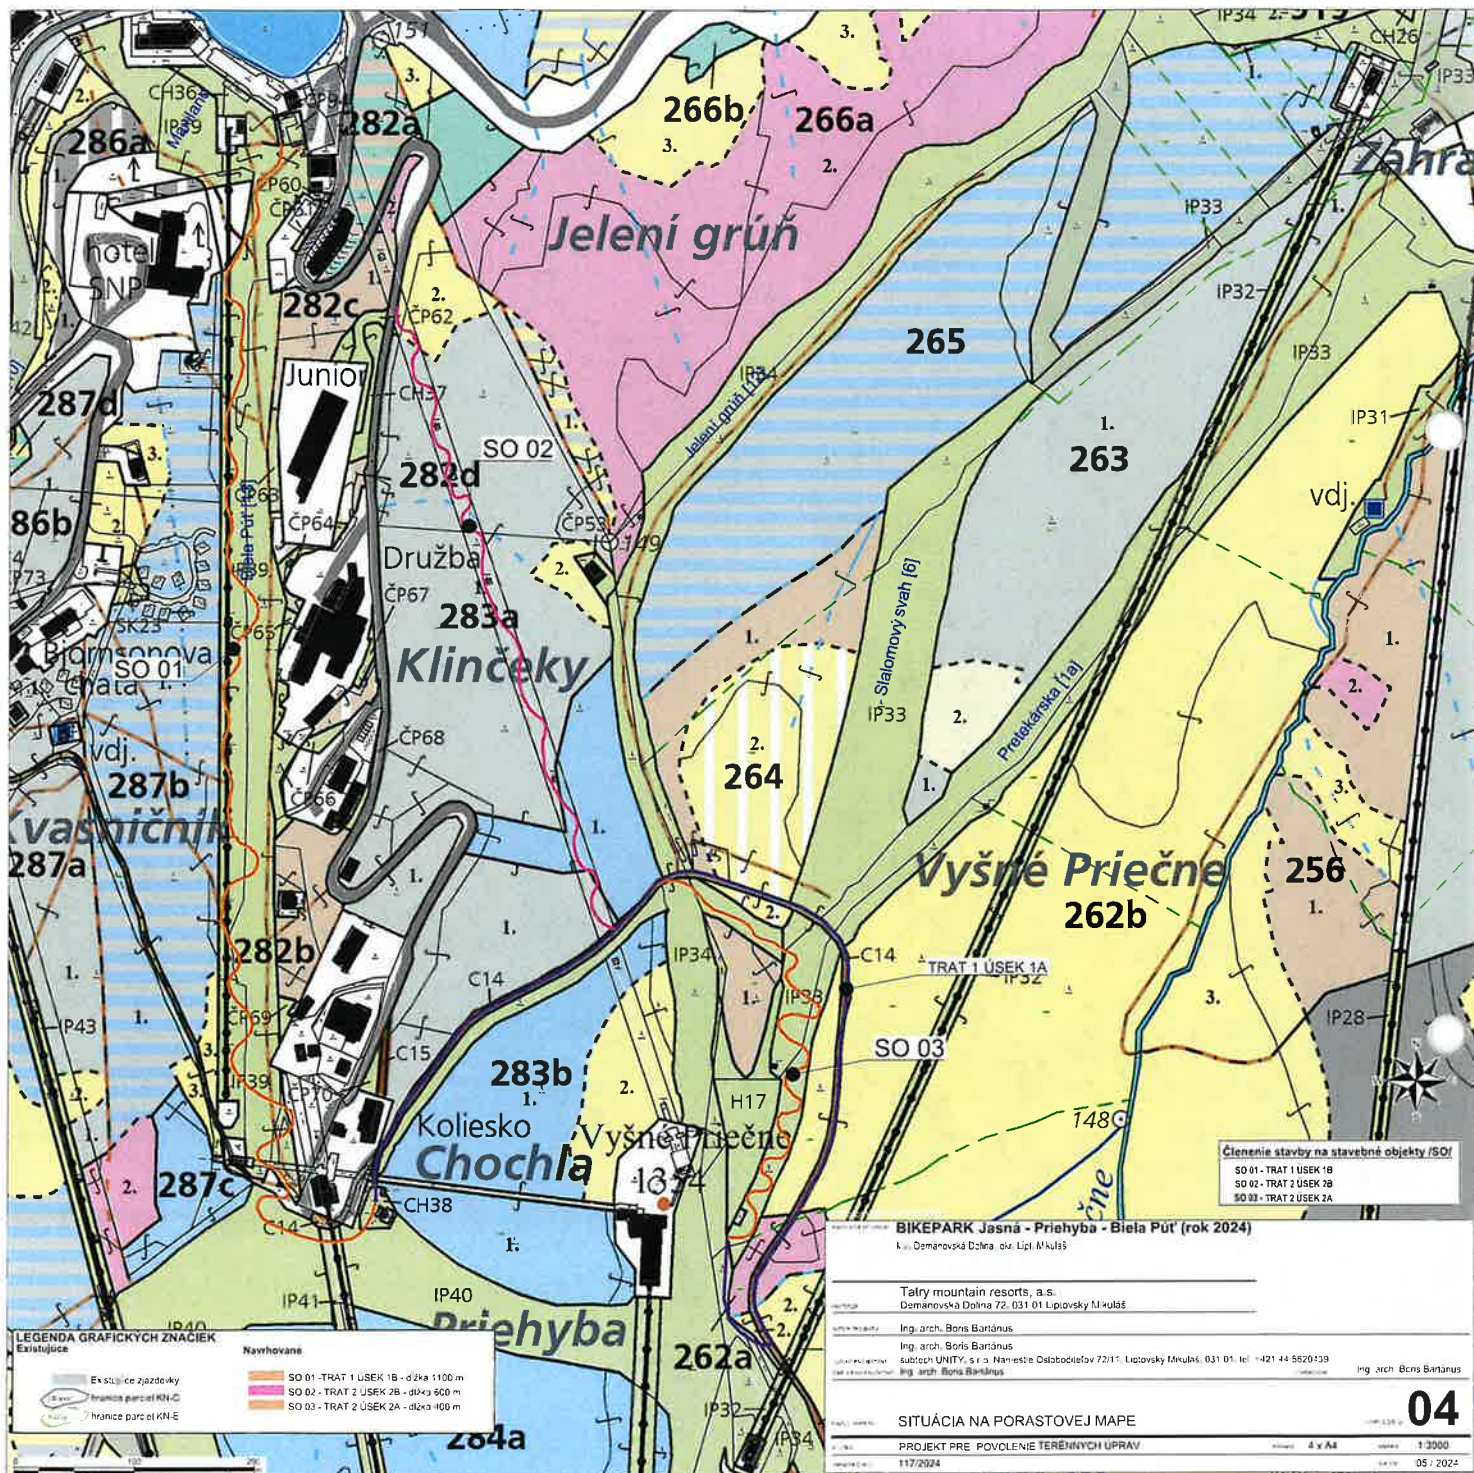

TRAT c.1 - POZDLŽNY PROFIL

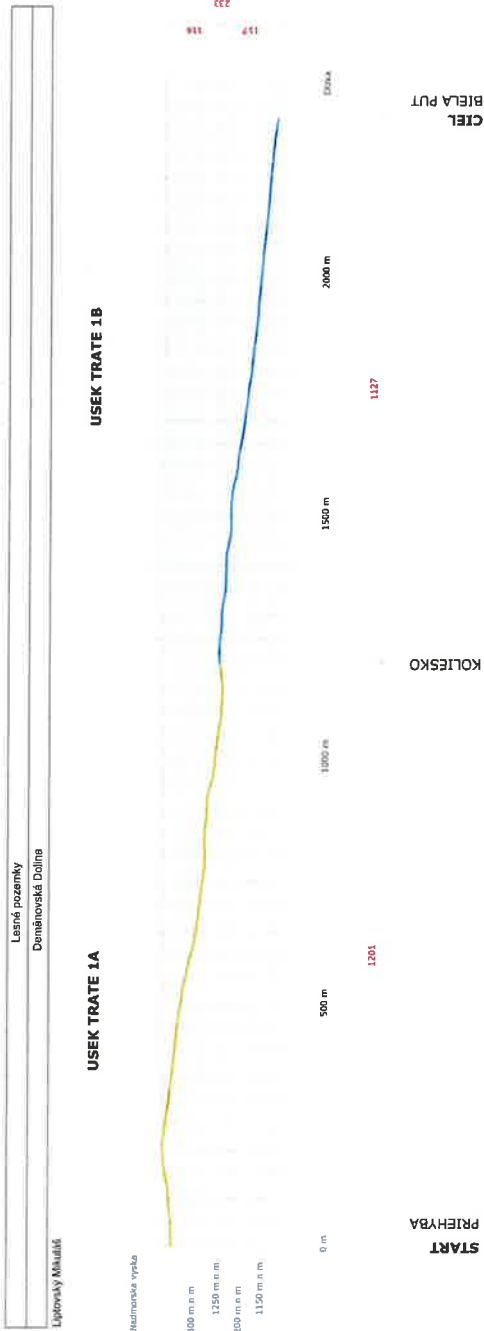

TRAT c.2 - POZDLŽNY PROFIL

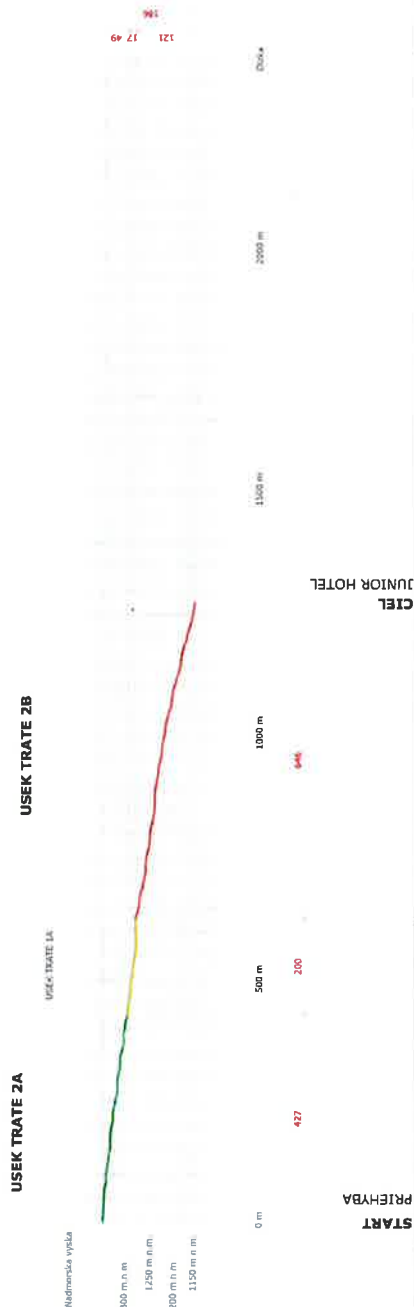

BIKEPARK Jasná - Priehyba - Biela Put (rok 2024)

k.ú. Demánovská Dolina, okr. Lipa, Mikuláš
Tatry mountain resorts, a.s.
Demánovská Dolina 72, 031 01 Lipovský Mlýnský
Ing. arch. Boris Barátius
Ing. arch. Boris Barátius
súťažiaci UNITÝ, s.r.o. Námestie Osvoboditeľov 72/11, Lipovský Mlýnský, 031 01, tel. +421 44 5620439
Ing. arch. Boris Barátius

POZDĹŽNE PROFILY

PROJEKT PRE POVOLENIE TERÉNNÝCH ÚPRAV

11/7/2024

1:1000

3 x A4

05/2024

07

NAVRH TRATU PRE HORSKU CESTU
PREHIBA - BILA PUT
NAVRH ODSAJE 2 SUNJAL, VZAJOMNI SA RIZIKU
TRAT (TRAT C 2) SO STARTNI NA PREHIBIT A
CJELOM NA BIELA PUTI. OBDIVITRAT SU ROZDELNE NA
DVA USEKY (1A, 1B A 2A 2B) TIETO USEKY
JISA CHARAKTERIZUJE PARAMETRI

Year	Rate
2000	1.2
2001	1.3
2002	1.4
2003	1.5
2004	1.6
2005	1.7
2006	1.8
2007	1.9
2008	2.0
2009	2.1
2010	2.2
2011	2.3
2012	2.4
2013	2.5
2014	2.6
2015	2.7
2016	2.8
2017	2.9
2018	3.0
2019	3.1
2020	3.2
2021	3.3
2022	3.4
2023	3.5
2024	3.6
2025	3.7
2026	3.8
2027	3.9
2028	4.0
2029	4.1
2030	4.2
2031	4.3
2032	4.4
2033	4.5
2034	4.6
2035	4.7
2036	4.8
2037	4.9
2038	5.0
2039	5.1
2040	5.2
2041	5.3
2042	5.4
2043	5.5
2044	5.6
2045	5.7
2046	5.8
2047	5.9
2048	6.0
2049	6.1
2050	6.2
2051	6.3
2052	6.4
2053	6.5
2054	6.6
2055	6.7
2056	6.8
2057	6.9
2058	7.0
2059	7.1
2060	7.2
2061	7.3
2062	7.4
2063	7.5
2064	7.6
2065	7.7
2066	7.8
2067	7.9
2068	8.0
2069	8.1
2070	8.2
2071	8.3
2072	8.4
2073	8.5
2074	8.6
2075	8.7
2076	8.8
2077	8.9
2078	9.0
2079	9.1
2080	9.2
2081	9.3
2082	9.4
2083	9.5
2084	9.6
2085	9.7
2086	9.8
2087	9.9
2088	10.0
2089	10.1
2090	10.2
2091	10.3
2092	10.4
2093	10.5
2094	10.6
2095	10.7
2096	10.8
2097	10.9
2098	11.0
2099	11.1
2100	11.2

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Členenie stavby na stavebné objekty /SO/

ú. Demänovská Dolina, okr. Upl. Mkulá3

Tatry mountain resorts, a.s.
Demänovská Dolina 72 031 01 Liptovský Mikuláš

arch Boris Baranov

100 arch Boite Barthelemy

subtech UNITY 5 r o Nán:ie

ing arch Boris Barilovus

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

POPIS A POLOHA

ПРОЕКТ ИИ: РОВНЕ

11/17/2024


100

06

0986

[illegible]

4707 / CN

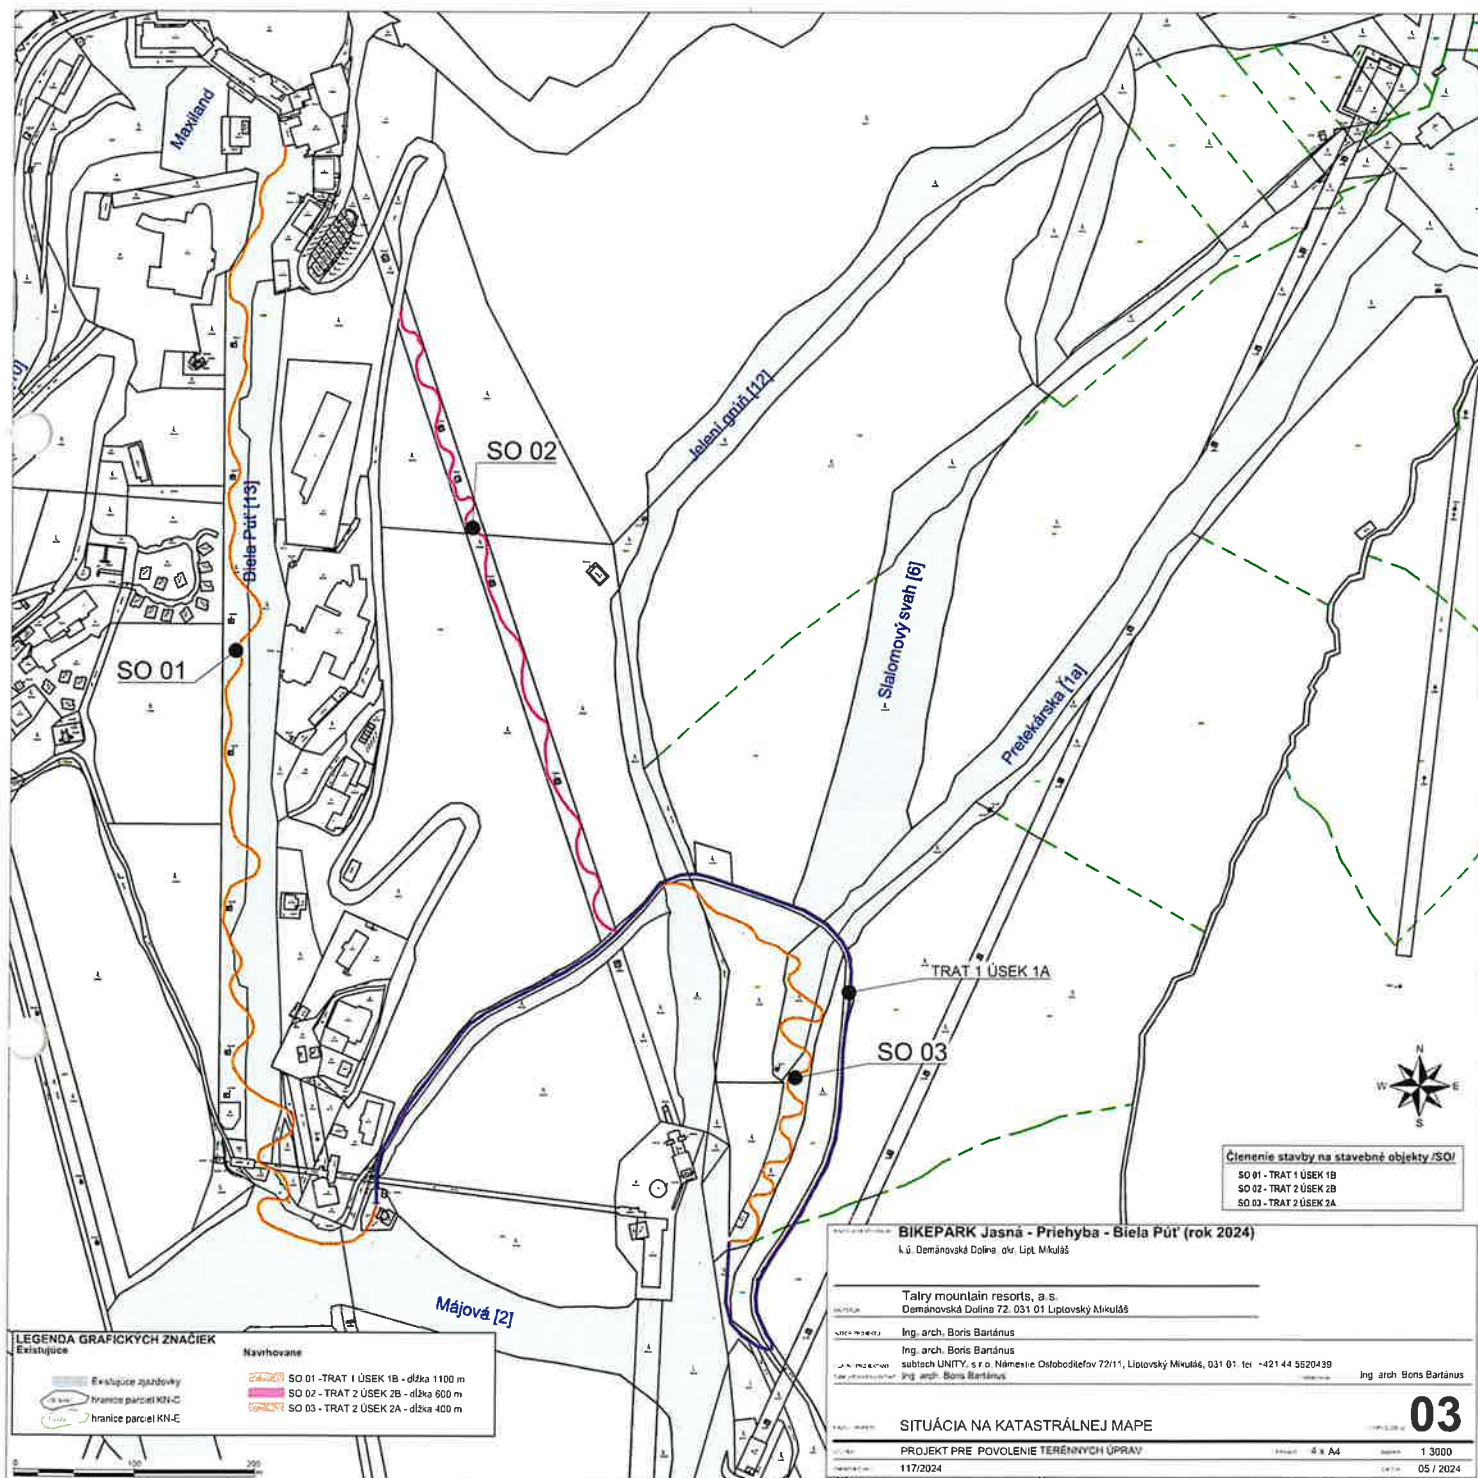

DETAIL 2A, 2B - PODORYS

TRAT č.2 - CHARAKTERISTIKA, PARAMETRE

USEK TRATE 2A

ZÁČIATOK USEKU 2A - PRIEHYBA
KONIEC USEKU 2A - "KRUŽOVATKA" TRÁVERZ / KORIDOR KABINOVEJ LANOVKY B PUT PRIEHYBA
JEDNOSMERNA TRAT PRE HORSKÚ CYKLISTIKU VYTVORENÁ TERÉNNÝMI ÚPRAVAMI VO FORME
ZEMNÝCH NÁSYPOV NA JESTVUJÚCOM TERÉNE, ZEMNÝCH ZÁREZOV V JESTVUJÚCOM TERÉNE
A JEDNODUCHÝCH DREVĚNÝCH MOSTÍKOV.
DREVĚNÉ MOSTY SU ZMONTOVANÉ ZO SMERKOVÉJ GULATINY A SMERKOVÝCH TOSK.
PROFIL TRATE VYTVARA KONTINUÁLNU SÉRIU TERÉNNÝCH VŮL.
RAMP A ZLOMOV, STŘEDNÝCH SA SO ZÁKRUTAMI ALEBO KLOPENTNÝ ZÁKRUTAMI.
CELKOVÁ DĹŽKA - 400m
PRIEMERANÁ ŠIRKA - 1,5m
PRIEMERNÝ SKLON - 18%
PREVÝSENIE - 70m

USEK TRATE 2B

ZÁČIATOK USEKU 2B - "KRUŽOVATKA" TRÁVERZ / KORIDOR KABINOVEJ LANOVKY B PUT PRIEHYBA
KONIEC USEKU 2B - BIELA PUT, NASTUPNÁ STANICA KABINOVEJ LANOVKY
JEDNOSMERNA TRAT PRE HORSKÚ CYKLISTIKU VYTVORENÁ TERÉNNÝMI ÚPRAVAMI VO FORME
ZEMNÝCH NÁSYPOV NA JESTVUJÚCOM TERÉNE, ZEMNÝCH ZÁREZOV V JESTVUJÚCOM TERÉNE
A JEDNODUCHÝCH DREVĚNÝCH MOSTÍKOV.
DREVĚNÉ MOSTY SU ZMONTOVANÉ ZO SMERKOVÉJ GULATINY A SMERKOVÝCH TOSK.
PROFIL TRATE VYTVARA KONTINUÁLNU SÉRIU TERÉNNÝCH VŮL.
RAMP A ZLOMOV, STŘEDNÝCH SA SO ZÁKRUTAMI ALEBO KLOPENTNÝ ZÁKRUTAMI.
CELKOVÁ DĹŽKA - 600m
PRIEMERANÁ ŠIRKA - 1,5m
PRIEMERNÝ SKLON - 20%
PREVÝSENIE - 120m


LEGENDA:

POVRCH TERENU

JESTVUJÚCI TEREN

ZEMNÝ NÁSYP

PRIECNY REZ 1



Číslenie stavby na stavebné objekty /SO/

SO 01 - TRAT 1 USEK 1B

SO 02 - TRAT 2 USEK 2B

SO 03 - TRAT 2 USEK 2A

BIKEPARK Jasná - Priehyba - Biela Put' (rok 2024)

k.ú. Dománovská Dolina okr. Lipt. Mikuláš

Tatry mountain resorts, a.s.

Dománovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš

Ing. arch. Boris Bariánus

Ing. arch. Boris Bariánus

subjekt UNITY, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 72/11, Liptovský Mikuláš 031 01, tel. +421 44 5620439

Ing. arch. Boris Bariánus

Radoslav Brychtu

Ing. arch. Boris Bariánus

VYBRANÝ DETAIL TRAT č.2

PROJEKT PRE POVOLENIE TERÉNNÝCH ÚPRAV

117/2024

4 x A4

1:3000


05/2024

09


3D POHLAD - TERENNA VLNA TVORENA ZEMNYM NASYPOM



3D POHĽAD - TERENNE RAMPY TVORENÉ ZEMNÝM NASTYPOM A DREVENÝM MOSTÍK

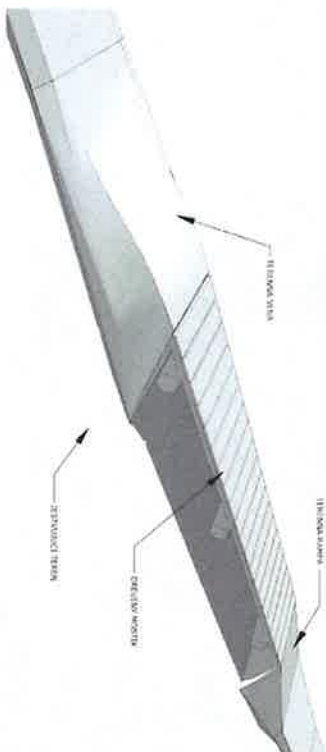

3D POHLAD - KLOPENE ZAKRUTY TVORENE ZEMNYM NASTYROM

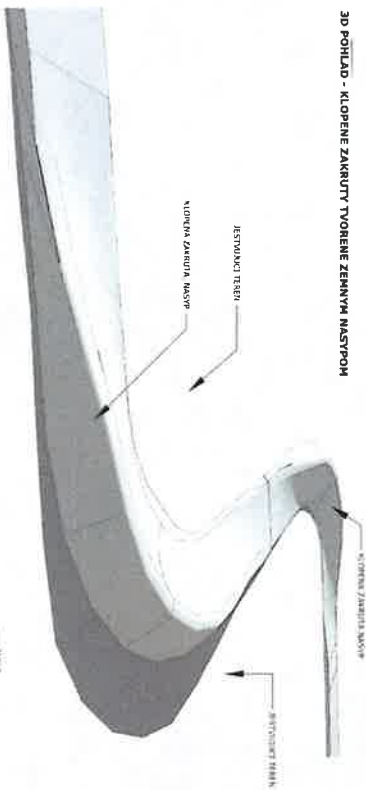

3D POHLAD - KLOPENE ZAKRUTY TVORENE ZEMNYM ZAREZOM A NASTYPM



BIKEPARK Jasná - Priehyba - Biela Púť (rok 2024)
k.ú. Demänovská Dolina, okr. Lipt. Mikuláš

Tatry mountain resorts, a.s.
Demänovská Doľina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš

AUTORE: ARIANNE
LEAVIN PRODUCTION
ZOOPICTURE PRODUCTIONS

Ing. arch. Boris Barčanuš
Ing. arch. Boris Barčanuš
sublech UNITY, s.r.o. Nám
Ing. arch. Boris Barčanuš

Radoslav Brychta
Ing. arch. **Boris Baránus**

3D POHLADY - TERÉNNÉ ÚPRAVY

PROJEKT PRE POVOLENIE TERÉNNÝCH ÚPRAV
11/7/2024

Zhuangzi's *Ci* 10

11/7/2024

format: 2 x A4

1:1000
05 / 2024

05 / 2024

10

SO 01 - TRAT 1 ÚSEK 1B
SO 02 - TRAT 2 ÚSEK 2B
SO 03 - TRAT 2 ÚSEK 2A

11/584


Protipožiarna lesná cesta
Kolesko - Priehyba

SO 02

Miestna komunikácia č. 4

SO 01

SO 03

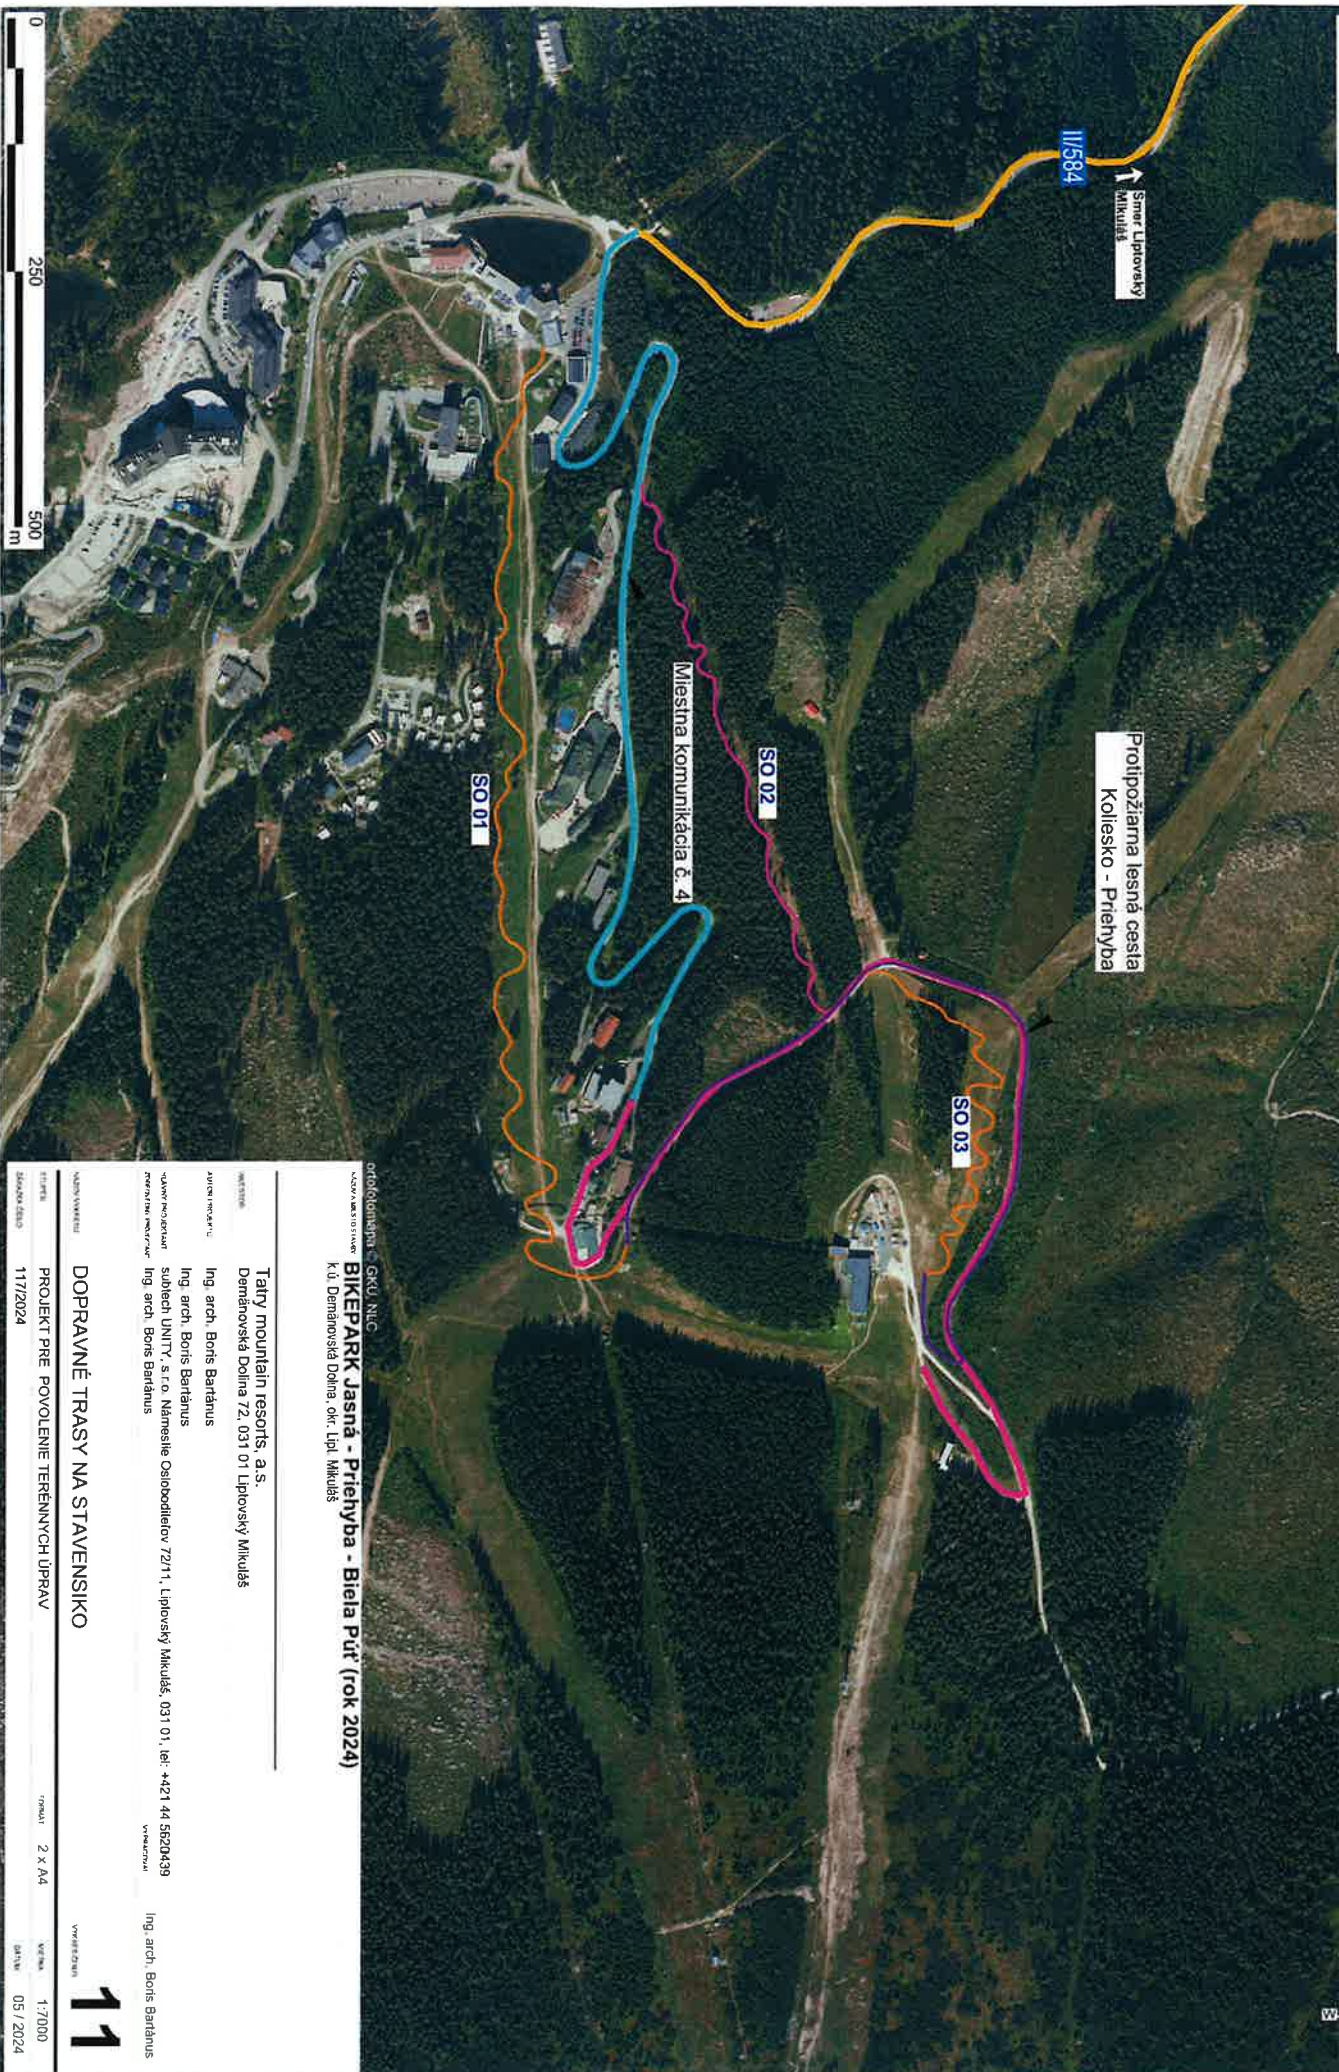

ортопедическая GKU, LLC

BIKEPARK Jasná - Priehyba - Biela Púť (rok 2024)
k ú. Demänovská Dolina, okr. Lipt. Mikuláš

Tatry mountain resorts, a.s.

Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš

Ing. arch. Bořis Bartánus

Ing. arch. Boris Bartánus


Ing. arch. Boris Baránus
súdieth UNĽ, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 72/11, Liptovský Mikuláš, 031 01, tel: +421 44 5620439

Ing. arch. Boris Barátus

DOPRAVNÉ TRASY NA STAVENSIKO


PROJEKT PRE POVOLENIE TERÉNŇNYCH ÚPRÁV
11/7/2024

www.elsevier.com

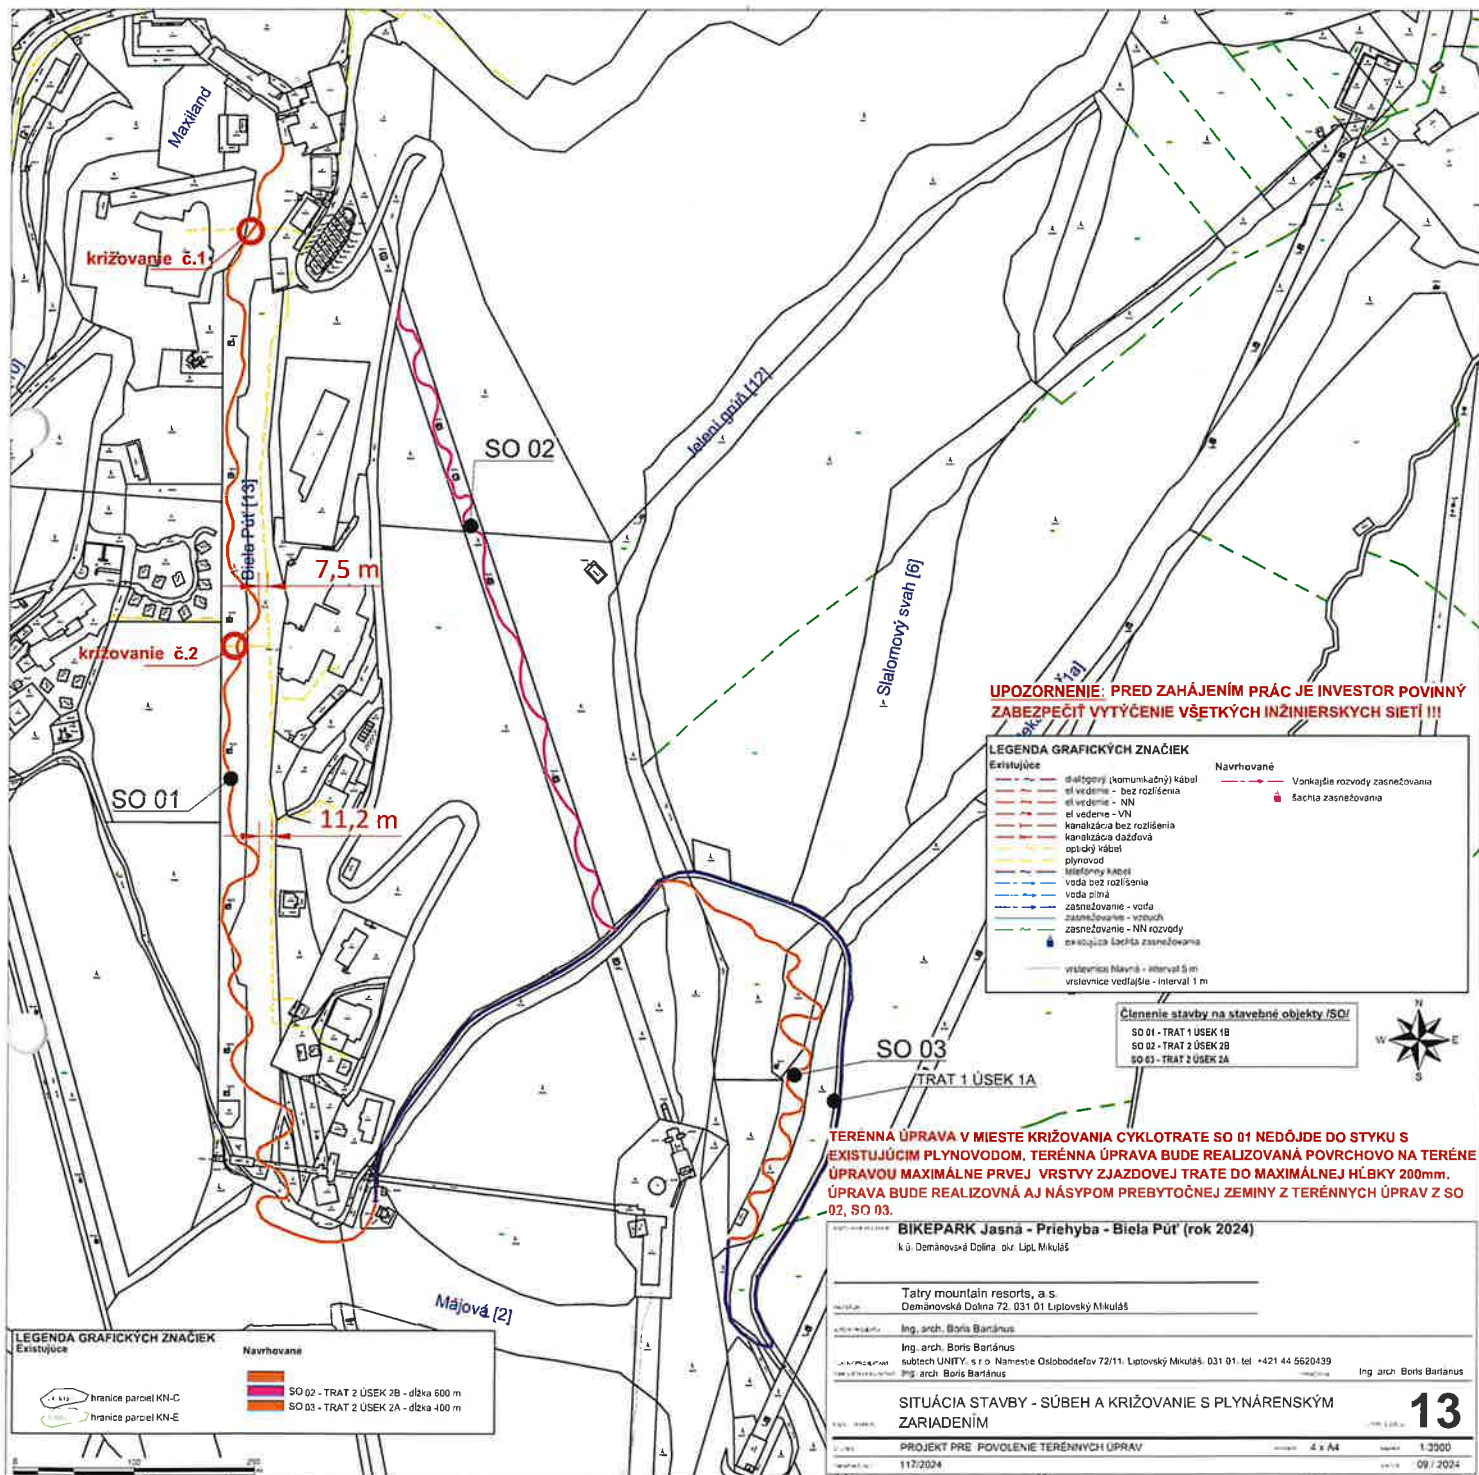

KRÍŽOVANIE č.1 a č.2

PRECHOD POPOD KOMUNIKÁCIU

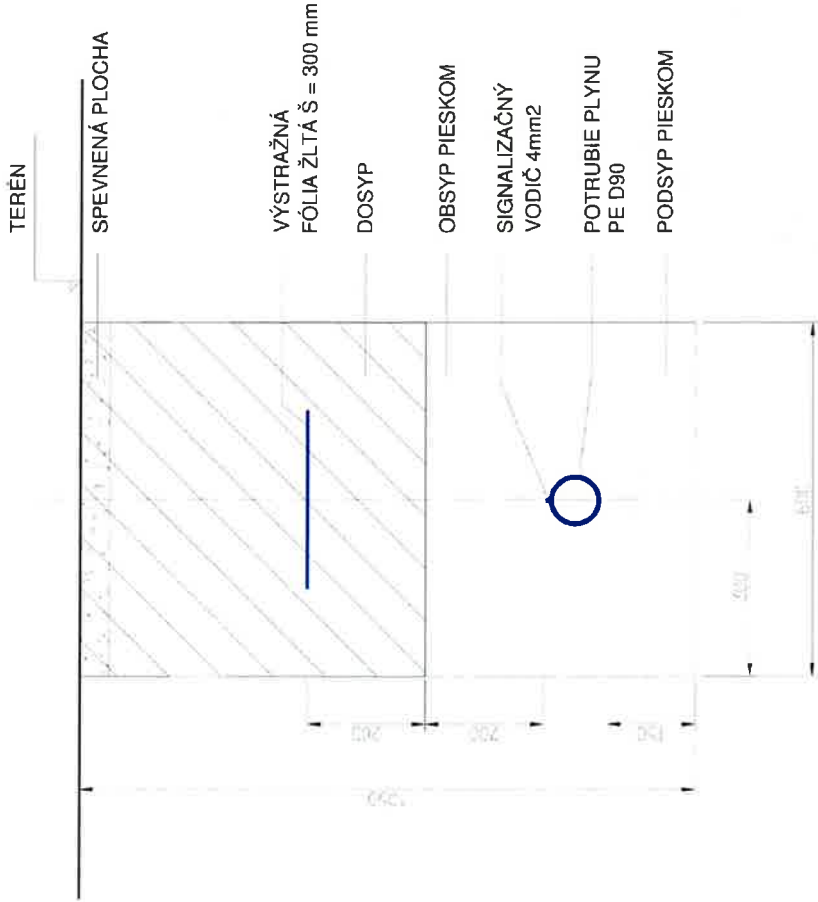


TERÉNNÁ ÚPRAVA V MIESTE KRÍŽOVANIA č.1 a č.2 CYKLO TRATE SO 01 NEDÔJDE DO STYKU S EXISTUJÚCIM PLYNOVODOM. TERÉNNÁ ÚPRAVA BUDE REALIZOVANÁ POVRCHOVO NA TERÉNE, ÚPRAVOU MAXIMÁLNE PRVEJ VRSTVY ZJAZDOVEJ TRATE DO MAXIMÁLNEJ HLBKY 200mm. ÚPRAVA BUDE REALIZOVANÁ AJ NÁSYPM PREBYTOČNEJ ZEMINY Z TERÉNNÝCH ÚPRAV Z SO 02, SO 03.

UPOZORNENIE

PRI SÚBEHU A KRÍŽOVANÍ POTRUBÍ DODRŽAŤ VZDIALENOSTI PODLA STN 73 6005. ULOŽENIE POTRUBIA A TVAR VÝKOPI JE MOŽNÉ UPRAVIŤ PODLA PREDPISU DODÁVATEĽA POTRUBIA.



PRECHOD CEZ RASTLÝ TERÉN

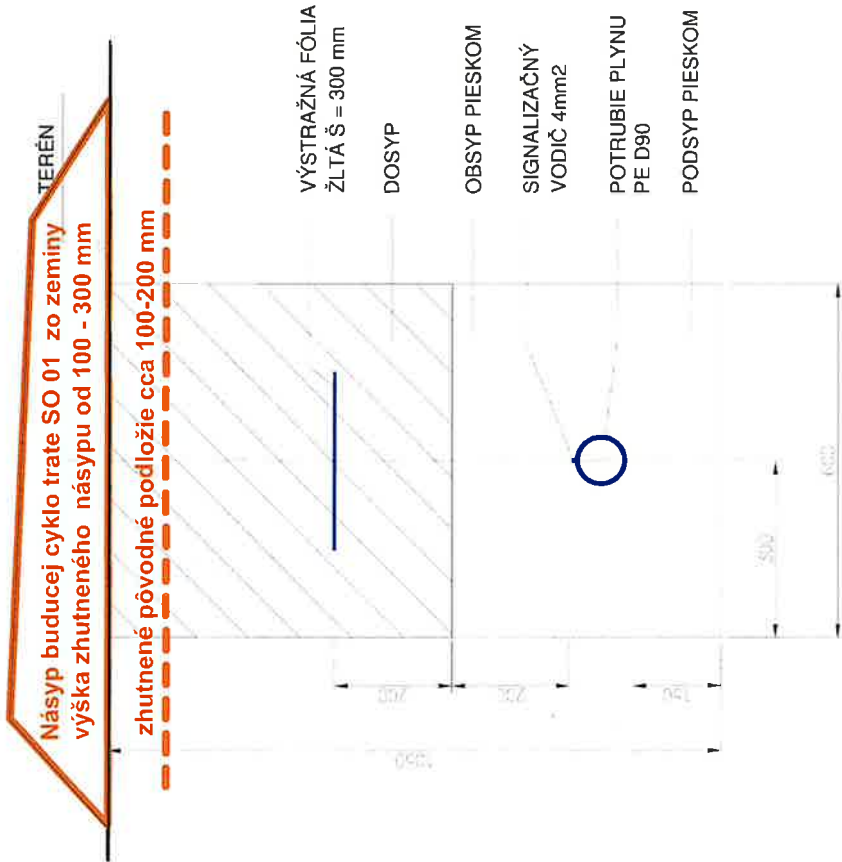

BIKEPARK Jasná - Priehyba - Biela Púť (rok 2024)

k.ú. Demánovská Dolina, okr. Lipt. Mikuláš

Tatry mountain resorts, a.s.

Demánovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš

Ing. arch. Boris Barátanús

Ing. arch. Boris Barátanús

Ing. arch. Boris Barátanús

Ing. arch. Boris Barátanús

DETAIL - SÚBEH A KRÍŽOVANIE S PLYNÁRENSKÝM ZARIADENÍM

PROJEKT PRP - POVOLENIE TERÉNNÝCH ÚPRAV

11/7/2024

14

1:20


09 / 2024

ODVODNENIE TRATI - OPIS

LEGENDA:

POVRCH TERENU
JESTVUJUCI TEREN
POVRCH TRATE SPREVANY KAMENMI
ODVODNOVACI ZLABO
ODVODNOVACIE POTRUBIE
POVRCHOVA VODA - SMER TOKU

ODVODNENIE TRATI - PRIECNE REZY

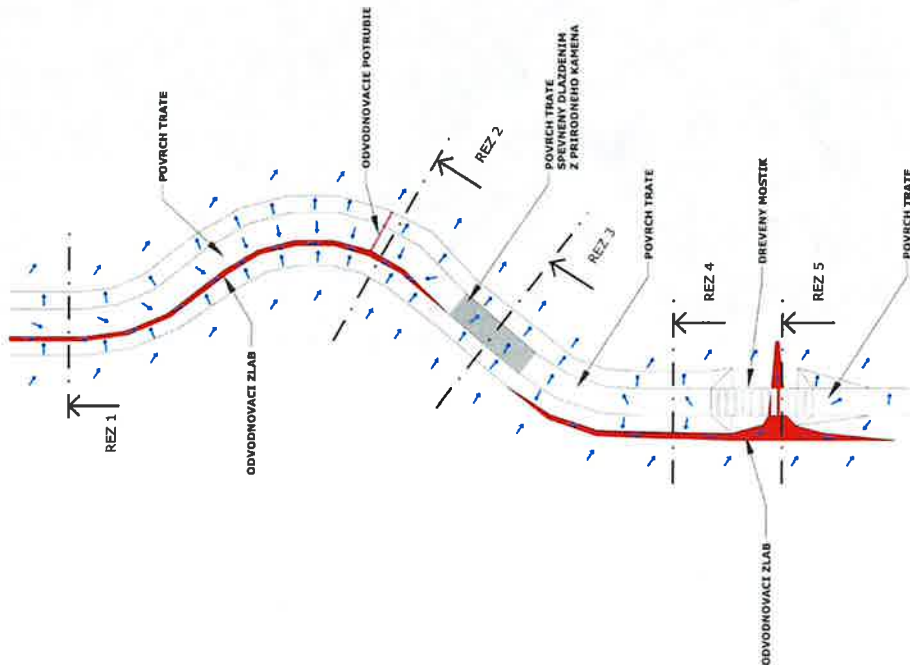

Členenie stavby na stavebné objekty /SO/

BIKEPARK Jasná - Príchyba - Biela Púť (rok 2024)

Dr. Ľ. Demčňanovská Dolná, okr. Lipt. Mikuláš

Tatry mountain resorts, a.s.
Dobšinská Dolina 72, 031 01 IL

tion and Boies Bartles.

low arch Boie's Baroque

United States TV, Inc. Name

SPÔSOBY ODVODNENIA TRATÍ

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 101–107

IX. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

620/2/211

05 / 2024

05 / 2024



ortofotomapa © GKÚ, NLC

NÁZOV A Miesto STAVBY **BIKEPARK Jasná - Priehyba - Biela Pút' (rok 2024)**
k.ú. Demánovská Dolina, okr. Lipt. Mikuláš

INVESTOR: **Tatry mountain resorts, a.s.**
Demánovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš

AUTOR PROJEKTU: **Ing. arch. Boris Bartánus**

Ing. arch. Boris Bartánus

HLAVNÝ PROJEKTANT: **subtech UNITY, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 72/11, Liptovský Mikuláš, 031 01, tel: +421 44 5620439**

ZOOPROJEKTOVÝ PROJEKTANT: **Ing. arch. Boris Bartánus**

VYPRACOVAL: **Ing. arch. Boris Bartánus**

NÁZOV VÝKRESU

SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV

VÝKRES ČÍSLO

01

STUPEŇ: **PROJEKT PRE POVOLENIE TERÉNNYCH ÚPRAV**

FORMÁT: **1 x A4**

MIERKA: **1:10 000**

ZÁKAZKA ČÍSLO: **117/2024**

DATUM: **05 / 2024**

BIKEPARK Jasná - Priehyba – Biela Púť (rok 2024)

stredisko CHOPOK sever, k.ú. Demänovská Dolina

NÁZOV A MIESTO STAVBY: **BIKEPARK Jasná – Priehyba – Biela púť (rok 2024)**

INVESTOR : Tatry mountain resorts, a.s.
Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský
Mikuláš
IČO 31 560 636

AUTOR PROJEKTU: Ing. Arch. Boris Bartánus
HLAVNÝ PROJEKTANT : Ing. Arch. Boris Bartánus
subtech UNITY s.r.o., Námestie Osloboditeľov 72/11,
Liptovský Mikuláš

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Arch. Boris Bartánus

B – TECHNICKÁ SPRÁVA

STUPEŇ: **Projekt pre povolenie terénnych úprav**

ZÁKAZKA: 117/2024

PARÉ:

DÁTUM: 05/2024

B – TECHNICKÁ SPRÁVA

Obsah:	strana:
I. Identifikačné údaje o stavbe, investorovi a spracovateľovi	3
II. Charakteristika územia	4
III. Urbanistické a stavebno – technické riešenie	5
IV. Ochranné a bezpečnostné opatrenia	6
V. Starostlivosť o životné prostredie	6
VI. Predpisy BOZP	7
VII. Väzby na okolitú výstavbu, starostlivosť o bezpečnosť práce	7
VIII. Záver	7

I. Identifikačné údaje o stavbe, investorovi a spracovateľovi

Názov stavby: BIKEPARK Jasná - Priehyba - Biela Púť (rok 2024)
Miesto stavby: stredisko Chopok sever
Okres: Liptovský Mikuláš
Kraj: Žilinský samosprávny kraj

Typ stavby: účelové objekty pre šport, rekreáciu a cestovný ruch
– horské cyklistické trate

Kategória: SO 01 – ľahká, SO 02 – ťažká, SO 03 – Stredne ťažká

Katastrálne územie: Demänovská Dolina

Právny vzťah:

Stavebný objekt	KNC č.	Druh pozemku	LV	Vlastník
SO 01, TRAŤ 1 úsek 1B	2921/142	LP	266	Pozemkové spoločenstvo Ploštín/ Urbár Vrbica, pozemkové spoločenstvo / TMR a.s. - nájomca
	2921/485	LP		
	2921/525	LP		
	2921/256	Zastavaná plocha a nádvorie		
	2922/44	Zastavaná plocha a nádvorie		
	2921/249	LP		
	2921/163	LP		
	2922/8	LP		
	2922/9	LP		
	2922/40	Zastavaná plocha a nádvorie		
SO 02, TRAŤ 2 úsek 2B	2921/279	LP	266	Pozemkové spoločenstvo Ploštín/ Urbár Vrbica, pozemkové spoločenstvo / TMR a.s. - nájomca
	2921/550	LP		
SO 03, TRAŤ 2 úsek 2A	2947/128	LP	238	Pozemkové spoločenstvo Ploštín / TMR a.s. - nájomca
	2947/132	LP		
	2947/72	LP		

INVESTOR: Tatry mountain resorts, a.s.,
Demänovská Dolina 72,
03101 Liptovský Mikuláš,
IČO 31560636
DIČ 2020428036

SPRACOVATEĽ PD: subtech UNITY s.r.o.,
Námestie Osloboditeľov 72/11,
03101 Liptovský Mikuláš

Zodpovedný projektant: Ing. Arch. Boris Bartánus

II. Charakteristika územia

a) Zhodnotenie polohy a stavu územia

Dotknuté územie sa nachádza v Nízkych Tatrách, v stredu Chopok sever, extravilán obce k.ú. Demänovská Dolina, na území Národného parku Nízke Tatry, kde platí III. stupeň ochrany prírody. Navrhované cyklistické trate začínajú v lokalite Priehyba a končia v lokalite Biela Púť.

V navrhovanom území má Investor v záujme vybudovať horské cyklistické trate. Uvedený záber cyklistických tratí je lokalizovaný na severných svahoch Chopka. Územie má horský charakter. Vegetácia je tvorená prevažne trávnyimi porastmi, v súčasnosti využívané ako zjazdové trate a trasa Lanovej dráhy Biela Púť – Priehyba.

Stavba je účelová – typ terénne úpravy, rieši úpravu plochy záberu na existujúcich zjazdových tratiach a trase LD vo forme zemných násypov a zárezov: ZT č. 13 Biela Púť – č. 2 Májová, ZT č. 1 Pretekárska a trasa LD Biela Púť – Priehyba. Bude sa jednať o jednosmerné trate pre horskú cyklistiku, ktoré budú doplnené o drevené mostíky vyhotovené zo smrekovej guľatiny. Profily jednotlivých tratí bude vytvárať kontinuálnu sériu terénnych vln, rámp a zlomov, striedajúcich sa so zákrutami, alebo klopenými zákrutami.

Záber plôch z hľadiska terénnych úprav na uvedených parcelách bude:

SO 01 , Trať 1 úsek 1B: plocha horskej cyklistickej trate: 1761,16 m², dĺžka 1100,00 m;

SO 02, Trať 2 úsek 2B: plocha horskej cyklistickej trate: 927,97 m², dĺžka 600,00 m;

SO 03, Trať 2 úsek 2A: plocha horskej cyklistickej trate: 776,89 m², dĺžka 400,00 m;

Vytvorením horských cyklistických tratí na existujúcich zjazdových tratiach v navrhovanom úseku sa prevádzkovateľ rozhodol vylepšiť podmienky letného cestovného ruchu v stredu. Horská cyklistika patrí v súčasnosti k dynamicky sa rozvíjajúcim druhom oddychových športových aktivít. Uvedené rozšírenie aktivít doplní existujúce využitie plôch aj v letných mesiacoch. Horské cyklistické trate sú navrhnuté tak, aby ich náročnosť zvládla široká verejnosť. Jednosmerné vedenie tratí zabezpečí kontinuálnosť pohybu návštevníkov a zabezpečí vymedzený koridor pohybu návštevníkov v stredu. Vytvorením horských cyklistických tratí sa súčasne eliminuje pohyb návštevníkov mimo záujmové územie.

Terénne úpravy vylepšia existujúci stav zjazdových tratí/ horských cyklistických tratí, zároveň nebudú mať dlhodobý negatívny vplyv na životné prostredie. Úprava terénu zemnými prácami bude vykonaná so zreteľom na citlivosť územia. Po uvedených činnostiach bude terén upravený, tak aby zmeny neboli zreteľné, upravovaná časť splynie s okolitým prostredím, so zabezpečením protieróznej činnosti pôdy. Uvedené úpravy budú podliehať zároveň pravidelnej údržbe, ktoré sú vykonávané zo strany investora pravidelne každoročne sa opakujúc.

b) Údaje o použitých geodetických podkladoch

Priečne a pozdĺžne profily boli spracované na základe geodetického zamerania firmou LM-GEO s.r.o., Liptovský Mikuláš. Digitálna forma bola spracovaná v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom baltskom systéme po vyrovnaní, grafická dokumentácia v digitálnej forme programom CAD. Dodané podklady boli postačujúce pre vypracovanie dokumentácie pre územné konanie a povolenie terénnych úprav.

c) Príprava územia

Pred zahájením prác je potrebné vytýčenie plôch. Pred úpravou plôch nebude potrebné odlesnenie, po ukončení prác budú vykonané protierózne opatrenia.

III. Urbanistické a stavebno – technické riešenie

a) Urbanistické riešenie

Zámerom projektu je terénna úprava pre vytvorenie horských cyklistických tratí na existujúcich záberoch zjazdových tratí. Plochy využitia pre zjazdové trate остану bez zmien a terénna úprava nebude brániť ani nespôsobí zmenu využívania počas zimných mesiacov. Po vykonaní terénnych úprav budú zachované všetky väzby na súvisiacu už vybudovanú štruktúru a napojenie na využívané pozemky.

b) Stavebno–technické riešenie

Terénne úpravy

Terénne úpravy na existujúcich zjazdových tratiach pre vytvorenie horských cyklistických tratí na uvedených parcelách bude v celkovej ploche:

SO 01, Trať 1 úsek 1B:

plocha horskej cyklistickej trate: 1761,16 m², dĺžka 1100,00 m, šírka 1,50 m;

SO 02, Trať 2 úsek 2B:

plocha horskej cyklistickej trate: 927,97 m², dĺžka 600,00 m, šírka 1,00 m;

SO 03, Trať 2 úsek 2A:

plocha horskej cyklistickej trate: 776,89 m², dĺžka 400,00 m, šírka 1,50 m;

Pri terénnych úpravách bude vykonaný odkop prebytočnej zeminy, ktorá bude použitá do násypu. Bager bude odkopávať pôdu z vrchnej strany svahu a pred sebou tvoriť trať. Budované budú vlny, skoky, klopené zákruty a ďalšie prekážky. Odvodnenie zemnej pláne je zabezpečené prirodzeným spôsobom – priemerným pozdĺžnym sklonom cca 10 - 20 %. Odvodnenie tratí je riešené kontinuálne priečnym sklonom, lokálne je členené terénnymi vlnami. Počas finálnych terénnych úprav budú na upravovanej ploche vybudované, doplnené odvodňovacie žľaby podľa potreby. Priečne odvodňovacie žľaby budú nadväzovať na existujúce priečne odvodnenie zjazdových tratí. Pozdĺžny a priečny sklon je zrejmy z výkresovej časti dokumentácie.

Plocha násypu, výkopu bude po vykonaní terénnej úpravy ošetrená proti erózii. Ošetrovanie funkčných plôch na lesných pozemkoch rieši samostatný rekultivačný projekt.

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 - Trať 1 úsek 1B

SO 02 - Trať 2 úsek 2B

SO 03 - Trať 2 úsek 2A

c) Zemné práce

Zemné práce pozostávajú z úpravy staveniska – výkop/ násyp v rámci plôch pre vytvorenie horských cyklistických tratí, terénnych úprav novovytvorených častí, rekultivácie. Celková bilancia presunov zeminy je zrejmy z výkresovej časti projektovej dokumentácie.

V súvislosti s činnosťou nedôjde ku vzniku odpadov. Výkopová zemina (kód odpadu 170506-O) bude uložená do násypov v rámci upravovaných plôch.

Pred zahájením zemných prác je investor povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení nachádzajúcich v mieste terénnych úprav, zároveň zabezpečiť ich ochranu.

Miesto terénnych úprav bude dostupné pre stavebnú techniku z lokality Biela Púť - Koliesko, po protipožiarnej lesnej ceste podľa priloženej situácie (výkres č. 11), kde sú uvedené vzdialenosti.

Práce na terénnych úpravách z hľadiska využitia jednotlivých technológií nie sú zložité. Prístup na stavenisko je dobrý. Zemné práce budú vykonávané bagrom, pri ktorej bude potrebné preloženie zeminy, prípadne kamene z výkopu do násypu. Na spodnú časť násypu bude uložený rozpojený kameň, naň bude uložená rozpojená výkopová zemina. Takto vytvorená plocha sa prekryje senom alebo slamou, v prípade zabezpečenia vyššej stability aj s použitím geotextílie. Táto technológia zabezpečí stabilitu svahu a protieróziu ochranu.

IV. Ochranné a bezpečnostné opatrenia

Ochranné a bezpečnostné zariadenia sa v projekte neriešia, pretože tieto sú riešené v rámci strediska pre informovanie pohybu klientov v stredisku (ochranné siete, značenie, informačné tabule a pod.).

V. Starostlivosť o životné prostredie

Územie sa nachádza v území národného parku s III. stupňom ochrany prírody, mimo územia sústavy NATURA 2000. Činnosť bude vykonaná maximálne citlivo v súlade s určenými podmienkami dotknutých strán. V rámci pravidelných udržiavacích prác bude lokalita pravidelne kontrolovaná a udržiavaná. Rekultivácia plôch bude zabezpečená bezprostredne po skončení terénnych úprav, opakovane, kým plochy nesplynú s okolitým prostredím.

Terénna úprava plochy nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Pri realizácii je potrebné zo strany dodávateľa prác dodržať nasledovné opatrenia:

- plochy narušené výstavbou uviesť do pôvodného stavu,
- prihliadať a zabrániť poškodzovaniu okolitého terénu, pri prácach postupovať s maximálnou citlivosťou s prihliadnutím na stupeň ochrany prírody v záujmovom prostredí, v prípade porušenia krovín – zvoliť adekvátnu náhradu,
- počas realizácie zabezpečiť priestor staveniska proti vstupu nepovolaným osobám,
- pri výjazde zo staveniska očistiť mechanizmy využívané pri terénnych úpravách,
- vytýčenie plôch bude vykonané v súlade s platnosťou určených noriem.

Dôležité upozornenie !

Pri výstavbe dôjde ku kontaktu s podzemnými vedeniami. Zistené siete sú zakreslené vo výkresovej dokumentácii. Pred začatím zemných prác zabezpečí investor vytýčenie všetkých podzemných vedení. Vlastné výkopové práce je možné zahájiť až po ich presnom vytýčení v teréne. **Navrhovaná cyklo trať 1 SO 01 – úsek 1B je vedený po Zjazdovej trati Biela púť č.13 a pretína stredotlakové potrubie plynovodu – SPP distribucia a.s. - pripojenia hotela SNP a hotela Bjorson . križovanie č.1 a č.2 vo výkrese č.13 tejto dokumentácie. Realizácia cyklo trate 1, SO 01 – úsek 1B nezasahuje do rastlého terénu, a je realizovaná zhutnenými minimálnymi násypmi od 150-300mm podľa klopieň z odkopanej zeminy v iných častiach Bike parku (trat SO 02). Pôvodný terén v tomto úseku bude splanýňovaný a zhutnený, s minimálnymi zasahmi pod rastlý terén (100-200mm) a tým bude pripravený podklad na násypy.**

Odpadové hospodárstvo

Pri realizácii terénnych úprav vzniknú presuny zeminy. Vytážená zemina v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje „Katalóg odpadov“ sa považuje za výkopovú zeminu čistú (č. 17 05 06) a bude použitá na zriadenie násypov a terénnych úprav na zjazdovej trati.

Tabuľka č. 1: Tvorba možných odpadov

Číslo skupiny, podskupiny, a druhu odpadu	Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu	Kategória odpadu
02 01 07	Odpady z lesného hospodárstva	(O)
17 05 06	Výkopová zemina čistá	(O)

Všetky vzniknuté odpady možno považovať za čisté, odpady z lesného hospodárstva a výkopová zemina budú použité na mieste stavby ako podklad pre rozširované plochy a na finálne dotváranie terénu pre dosiahnutie optimálnych podmienok.

VI. Predpisy BOZP

Stavebné práce je potrebné vykonávať podľa platných noriem a zachovať všetky potrebné predpisy v oblasti BOZP a PO. Z hľadiska ochrany pracovníkov je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy. Pracovisko musí byť zaistené prípadným vznikom pracovných úrazov, porúch a havárii mechanizmov.

Projektantovi nie sú známe neodstrániteľné nebezpečenstvá. Investor a dodávateľ je povinný sledovať a vyhodnocovať možné nebezpečenstvá a prijímať účinné opatrenia na ich odstránenie alebo na ich obmedzenie. V navrhovanom riešení sa nenachádzajú zdroje ohrozenia zdravia a bezpečnosti pri práci.

VII. Väzby na okolitú výstavbu, starostlivosť o bezpečnosť práce

Terénne úpravy sa budú realizovať nezávisle od akejkoľvek inej činnosti a neobmedzia činnosť a prevádzku na priľahlých pozemkoch. Z časového hľadiska nebude stavba viazaná na inú akciu. Po vytýčení stavby v zmysle PD je možné pristúpiť k úpravám plôch. Stavba (terénne úpravy) vzhľadom na svoj charakter nevyžaduje osobitné podmienky z hľadiska ochrany osôb a majetku. Pre zabezpečenie realizácie je potrebné dodržanie platných legislatívnych predpisov, hlavne v oblasti BOZP a PO. Pracovisko musí byť zaistený pred prípadným vznikom pracovných úrazov, porúch a havárii mechanizmov.

VIII. Záver

Projektová dokumentácia je vyhotovená v rozsahu pre vydanie územného rozhodnutia v zmysle platnej legislatívy SR – tu: stavebného zákona v platnom znení (i) o využití územia podľa § 39b s prihliadnutím na ods. 4 § 39b (nové časti záberu), a povolenie podľa § 71 (terénne úpravy na už vytvorených ZT).

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 0005
Stavba: BIKEPARK Jasná - Priehyba - Biela Púť

JKSO:
Miesto: k.ú. Demänovská Dolina

ČS:
Dátum: 15.5.2026

Objednávateľ:
Tatry mountain resorts, a.s.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MK TRAIL PROS, s. r. o.

IČO: 52480674
IČ DPH: SK2121063252

Projektant:
Ing. arch. Boris Bartánus

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Matej Haluška

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	115 006,00
--------------	------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
DPH znížená	23,00%	115 006,00	26 451,38

Cena s DPH	v	EUR	141 457,38
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objedn

Dátum

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0005

Stavba: BIKEPARK Jasná - Priehyba - Biela Púť

Miesto: k.ú. Demänovská Dolina

Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ: Tatry mountain resorts, a.s.

Projektant: Ing. arch. Boris Bartánus

Zhotoviteľ: MK TRAIL PROS, s. r. o.

Spracovateľ: Matej Haluška

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		115 006,00	141 457,38
0006	TRAT 1 USEK 1A	9 380,00	11 537,40
0007	TRAT 1 USEK 1B	48 780,00	59 999,40
0008	TRAT 2 USEK 2A	22 101,00	27 184,23
0009	TRAT 2 USEK 2B	34 745,00	42 736,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

BIKEPARK Jasná - Priehyba - Biela Púť

Objekt:

0006 - TRAT 1 USEK 1A

JKSO:

Miesto: k.ú. Demänovská Dolina

ČS:

Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ:

Tatry mountain resorts, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MK TRAIL PROS, s. r. o.

IČO:

52480674

IČ DPH:

SK2121063252

Projektant:

Ing. arch. Boris Bartánus

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Matej Haluška

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 380,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	9 380,00	23,00%	2 157,40

Cena s DPH

v EUR

11 537,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

BIKEPARK Jasná - Priehyba - Biela Púť

Objekt:

0006 - TRAT 1 USEK 1A

Miesto:

k.ú. Demänovská Dolina

Dátum:

15.05.2026

Objednávateľ:

Tatry mountain resorts, a.s.

Projektant:

Ing. arch. Boris
Bartánus

Zhotoviteľ:

MK TRAIL PROS, s. r. o.

Spracovateľ:

Matej Haluška

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 380,00

HSV - Práce a dodávky HSV

5 480,00

1 - Zemné práce

5 480,00

M - Práce a dodávky M

3 600,00

60-M - Geodetické a kartografické práce a služby

3 600,00

N00 - Ostatné konštrukcie a práce

300,00

N01 - Značenie

300,00

ROZPOČET

Stavba:

BIKEPARK Jasná - Priehyba - Biela Púť

Objekt:

0006 - TRAT 1 USEK 1A

Miesto:

k.ú. Demänovská Dolina

Dátum:

15.05.2026

Objednávateľ:

Tatry mountain resorts, a.s.

Projektant:

Ing. arch. Boris
Bartánus

Zhotoviteľ:

MK TRAIL PROS, s. r. o.

Spracovateľ:

Matej Haluška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 380,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 480,00

D 1

Zemné práce

5 480,00

1	K	111101102.S	Odstránenie trávín a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	2 400,000	1,70	4 080,00
2	K	111201102.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m2	1 000,000	1,40	1 400,00

D M

Práce a dodávky M

3 600,00

D 60-M

Geodetické a kartografické práce a služby

3 600,00

5	K	960101002.S	Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby - stavebné objekty líniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete	bod	40,000	20,00	800,00
3	K	960101013.S	Podrobné vytýčenie objektov a technologických zariadení stavby - ostatné líniové stavby	bod	40,000	25,00	1 000,00
4	K	960121011.S	Zameranie a zobrazenie priebehu podzemného a nadzemného vedenia	100 m	12,000	150,00	1 800,00

D N00

Ostatné konštrukcie a práce

300,00

D N01

Značenie

300,00

6	K	1000012	vyznačenie trati	ks	15,000	20,00	300,00
---	---	---------	------------------	----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

BIKEPARK Jasná - Priehyba - Biela Púť

Objekt:

0007 - TRAT 1 USEK 1B

JKSO:

Miesto: k.ú. Demänovská Dolina

ČS:

Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ:

Tatry mountain resorts, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MK TRAIL PROS, s. r. o.

IČO:

52480674

IČ DPH:

SK2121063252

Projektant:

Ing. arch. Boris Bartánus

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Matej Haluška

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

48 780,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	48 780,00	23,00%	11 219,40

Cena s DPH

v EUR

59 999,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

BIKEPARK Jasná - Priehyba - Biela Púť

Objekt:

0007 - TRAT 1 USEK 1B

Miesto:

k.ú. Demänovská Dolina

Dátum:

15.05.2026

Objednávateľ:

Tatry mountain resorts, a.s.

Projektant:

Ing. arch. Boris
Bartánus

Zhotoviteľ:

MK TRAIL PROS, s. r. o.

Spracovateľ:

Matej Haluška

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

48 780,00

HSV - Práce a dodávky HSV

48 480,00

1 - Zemné práce	40 965,00
5 - Komunikácie	6 300,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	7 920,00
M - Práce a dodávky M	0,00
60-M - Geodetické a kartografické práce a služby	3 000,00
2 - Zakladanie	7 515,00
N00 - Ostatné konštrukcie a práce	300,00
N01 - Značenie	300,00

ROZPOČET

Stavba:

BIKEPARK Jasná - Priehyba - Biela Púť

Objekt:

0007 - TRAT 1 USEK 1B

Miesto:

k.ú. Demänovská Dolina

Dátum:

15.05.2026

Objednávateľ:

Tatry mountain resorts, a.s.

Projektant:

Ing. arch. Boris Bartánus

Zhotoviteľ:

MK TRAIL PROS, s. r. o.

Spracovateľ:

Matej Haluška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 780,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

48 480,00

D 1

Zemné práce

40 965,00

1	K	111101102.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	1 500,000	1,70	2 550,00
2	K	111201101.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	100,000	6,00	600,00
15	K	112201203.S	Odrezanie pňov s odpratáním na vzdialenosť 50 m, priemer nad 500 do 700 mm	ks	25,000	30,00	750,00
6	K	131101102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m3	m3	1 050,000	5,30	5 565,00
11	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	700,000	6,30	4 410,00
9	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	500,000	5,60	2 800,00
10	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	400,000	6,20	2 480,00
12	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	900,000	5,10	4 590,00

D 5

Komunikácie

6 300,00

33	K	564871311	ručná a strojová modelácia podkladov a tvaru dráhy	m2	1 500,000	4,20	6 300,00
----	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 762

Konštrukcie tesárske

7 920,00

36	K	762731120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	50,000	100,00	5 000,00
37	M	005456	spojovací materiál	m	50,000	20,00	1 000,00
38	M	052910002	smrekova guľatina	m3	4,000	220,00	880,00
39	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I	m3	4,000	260,00	1 040,00

D M

Práce a dodávky M

0,00

D 60-M

Geodetické a kartografické práce a služby

3 000,00

42	K	960101002.S	Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby - stavebné objekty líniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete	bod	30,000	20,00	600,00
43	K	960101013.S	Podrobné vytýčenie objektov a technologických zariadení stavby - ostatné líniové stavby	bod	30,000	25,00	750,00
44	K	960121011.S	Zameranie a zobrazenie priebehu podzemného a nadzemného vedenia	100 m	11,000	150,00	1 650,00

D 2

Zakladanie

7 515,00

20	K	212755118.S	Tratívd z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 200 mm	m	35,000	45,00	1 575,00
21	M	4401010095	Rúra KGEM 200 mm 5 m	ks	2,000	120,00	240,00
22	M	ŽLAB TBM 110-33	ŽLAB TBM 110-33 1100x500x330 PREFA Invest, a.s Sučany	ks	5,000	180,00	900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	102,000	25,00	2 550,00
13	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 500,000	1,50	2 250,00
D N00 Ostatné konštrukcie a práce							300,00
D N01 Značenie							300,00
24	K	1000012	vyznačenie trati	ks	15,000	20,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

BIKEPARK Jasná - Priehyba - Biela Púť

Objekt:

0008 - TRAT 2 USEK 2A

JKSO:

Miesto: k.ú. Demänovská Dolina

ČS:

Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ:

Tatry mountain resorts, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MK TRAIL PROS, s. r. o.

IČO:

52480674

IČ DPH:

SK2121063252

Projektant:

Ing. arch. Boris Bartánus

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Matej Haluška

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 101,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	22 101,00	23,00%	5 083,23

Cena s DPH

v EUR

27 184,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

BIKEPARK Jasná - Priehyba - Biela Púť

Objekt:

0008 - TRAT 2 USEK 2A

Miesto:

k.ú. Demänovská Dolina

Dátum:

15.05.2026

Objednávateľ:

Tatry mountain resorts, a.s.

Projektant:

Ing. arch. Boris
Bartánus

Zhotoviteľ:

MK TRAIL PROS, s. r. o.

Spracovateľ:

Matej Haluška

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 101,00

HSV - Práce a dodávky HSV

21 901,00

1 - Zemné práce	15 136,00
5 - Komunikácie	2 520,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	3 168,00
M - Práce a dodávky M	0,00
60-M - Geodetické a kartografické práce a služby	1 050,00
2 - Zakladanie	6 765,00
N00 - Ostatné konštrukcie a práce	200,00
N01 - Značenie	200,00

ROZPOČET

Stavba:

BIKEPARK Jasná - Priehyba - Biela Púť

Objekt:

0008 - TRAT 2 USEK 2A

Miesto:

k.ú. Demänovská Dolina

Dátum:

15.05.2026

Objednávateľ:

Tatry mountain resorts, a.s.

Projektant:

Ing. arch. Boris Bartánus

Zhotoviteľ:

MK TRAIL PROS, s. r. o.

Spracovateľ:

Matej Haluška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 101,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 901,00

D 1

Zemné práce

15 136,00

1	K	111101102.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	600,000	1,70	1 020,00
2	K	111201101.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	50,000	6,00	300,00
6	K	131101102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m3	m3	510,000	5,30	2 703,00
11	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	310,000	5,00	1 550,00
9	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	200,000	6,10	1 220,00
10	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	90,000	6,50	585,00
12	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	200,000	5,10	1 020,00

D 5

Komunikácie

2 520,00

33	K	564871311	ručná a strojová modelácia podkladov a tvaru dráhy	m2	600,000	4,20	2 520,00
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 762

Konštrukcie tesárske

3 168,00

36	K	762731120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	20,000	100,00	2 000,00
37	M	005456	spojovací materiál	m	20,000	20,00	400,00
38	M	052910002	smreková guľatina	m3	1,600	220,00	352,00
39	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I	m3	1,600	260,00	416,00

D M

Práce a dodávky M

0,00

D 60-M

Geodetické a kartografické práce a služby

1 050,00

42	K	960101002.S	Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby - stavebné objekty líniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete	bod	10,000	20,00	200,00
43	K	960101013.S	Podrobné vytýčenie objektov a technologických zariadení stavby - ostatné líniové stavby	bod	10,000	25,00	250,00
44	K	960121011.S	Zameranie a zobrazenie priebehu podzemného a nadzemného vedenia	100 m	4,000	150,00	600,00

D 2

Zakladanie

6 765,00

20	K	212755118.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 200 mm	m	35,000	45,00	1 575,00
21	M	4401010095	Rúra KGEM 200 mm 5 m	ks	7,000	120,00	840,00
22	M	ŽLAB TBM 110-33	ŽLAB TBM 110-33 1100x500x330 PREFA Invest, a.s Sučany	ks	5,000	180,00	900,00
23	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	102,000	25,00	2 550,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	600,000	1,50	900,00
D N00			Ostatné konštrukcie a práce				200,00
D N01			Značenie				200,00
24	K	1000012	vyznačenie trati	ks	10,000	20,00	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

BIKEPARK Jasná - Priehyba - Biela Púť

Objekt:

0009 - TRAT 2 USEK 2B

JKSO:

Miesto: k.ú. Demänovská Dolina

ČS:

Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ:

Tatry mountain resorts, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MK TRAIL PROS, s. r. o.

IČO:

52480674

IČ DPH:

SK2121063252

Projektant:

Ing. arch. Boris Bartánus

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Matej Haluška

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 745,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	34 745,00	23,00%	7 991,35

Cena s DPH

v EUR

42 736,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

BIKEPARK Jasná - Priehyba - Biela Púť

Objekt:

0009 - TRAT 2 USEK 2B

Miesto:

k.ú. Demänovská Dolina

Dátum:

15.05.2026

Objednávateľ:

Tatry mountain resorts, a.s.

Projektant:

Ing. arch. Boris
Bartánus

Zhotoviteľ:

MK TRAIL PROS, s. r. o.

Spracovateľ:

Matej Haluška

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

34 745,00

HSV - Práce a dodávky HSV

34 545,00

1 - Zemné práce

24 080,00

5 - Komunikácie

5 040,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

762 - Konštrukcie tesárske

5 040,00

M - Práce a dodávky M

0,00

60-M - Geodetické a kartografické práce a služby

1 575,00

2 - Zakladanie

10 465,00

N00 - Ostatné konštrukcie a práce

200,00

N01 - Značenie

200,00

ROZPOČET

Stavba:

BIKEPARK Jasná - Priehyba - Biela Púť

Objekt:

0009 - TRAT 2 USEK 2B

Miesto: k.ú. Demänovská Dolina

Dátum: 15.05.2026

Objednávateľ: Tatry mountain resorts, a.s.

Projektant: Ing. arch. Boris Bartánus

Zhotoviteľ: MK TRAIL PROS, s. r. o.

Spracovateľ: Matej Haluška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 745,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

34 545,00

D 1

Zemné práce

24 080,00

1	K	111101102.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	200,000	1,70	340,00
2	K	111201101.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	50,000	6,00	300,00
15	K	112201203.S	Odrezanie pŕhov s odprataním na vzdialenosť 50 m, priemer nad 500 do 700 mm	ks	25,000	40,00	1 000,00
6	K	131101102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m3	m3	750,000	5,30	3 975,00
11	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	250,000	5,00	1 250,00
9	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	500,000	5,10	2 550,00
10	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	400,000	6,20	2 480,00
12	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	100,000	5,30	530,00

D 5

Komunikácie

5 040,00

33	K	564871311	ručná a strojová modelacia podkladov a tvaru dráhy	m2	1 200,000	4,20	5 040,00
----	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 762

Konštrukcie tesárske

5 040,00

36	K	762731120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	30,000	100,00	3 000,00
37	M	005456	spojovací materiál	m	30,000	20,00	600,00
38	M	052910002	smrekova guľatina	m3	3,000	220,00	660,00
39	M	605110000100.S	Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I	m3	3,000	260,00	780,00

D M

Práce a dodávky M

0,00

D 60-M

Geodetické a kartografické práce a služby

1 575,00

42	K	960101002.S	Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby - stavebné objekty líniové - cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete	bod	15,000	20,00	300,00
43	K	960101013.S	Podrobné vytýčenie objektov a technologických zariadení stavby - ostatné líniové stavby	bod	15,000	25,00	375,00
44	K	960121011.S	Zameranie a zobrazenie priebehu podzemného a nadzemného vedenia	100 m	6,000	150,00	900,00

D 2

Zakladanie

10 465,00

20	K	212755118.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 200 mm	m	50,000	45,00	2 250,00
21	M	4401010095	Rúra KGEM 200 mm 5 m	ks	10,000	120,00	1 200,00
22	M	ŽLAB TBM 110-33	ŽLAB TBM 110-33 1100x500x330 PREFA Invest, a.s Sučany	ks	8,000	180,00	1 440,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	187,000	25,00	4 675,00
13	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	600,000	1,50	900,00
D N00			Ostatné konštrukcie a práce	200,00			
D N01			Značenie	200,00			
24	K	1000012	vyznačenie trati	ks	10,000	20,00	200,00

Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky: Bikepark Jasná - Priehyba - Biel Pút

Názov uchádzača: MK TRAIL PROS, s.r.o.

☒ * subdodávatelia sa nebudú podieľať na plnení zákazky a celý predmet zákazky uskutočnime vlastnými kapacitami

☐ * na plnení zákazky sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO):	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 11 ZVO sa povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa/subdodávateľov za podmienok podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum: 28.5.2026

odtlačok pečiatky uchádzača

* relevantné označte krížikom

